


**BALANCE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	\$ 26.529.124.225,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	\$ 26.526.380.863,00
VALOR ADICIÓN DEL PROYECTO 1	\$ 175.000.000,00
VALOR ADICIÓN DEL PROYECTO 2	\$ 581.263.253,00
VALOR ADICIÓN DEL PROYECTO 3 (presente modificación)	\$ 363.962.837,00
<b>VALOR FINAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$ 27.649.350.315,00</b>
RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA	
VALOR OBRA + SUPERVISIÓN	\$ 24.697.828.071,00
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISIÓN	\$ 19.088.951.316,08
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 21.800.311.062,00
<b>% DE AVANCE FÍSICO</b>	<b>77,29%</b>
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA	
VALOR GIRADO OBRA	\$ 21.903.262.418,00
VALOR GIRADO INTERVENTORA	\$ 2.202.717.764,00
VALOR GIRADO SUPERVISOR	\$ 194.161.155,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 24.300.141.337,00
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA %</b>	<b>89,06%</b>

**Línea de tiempo de ejecución del proyecto**

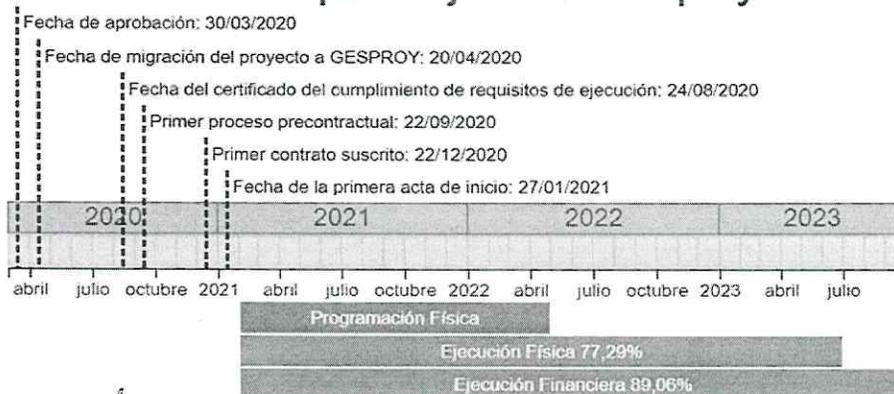

**CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO**  
Director Ejecutivo ASOMURA

**GUSTAVO BECERRA GIL**  
Director de Interventoría -CONSORCIO URABÁ 2020

ACTIVIDAD	NOMBRE	FIRMA Vo. Bo
Elaboró	Juan Camilo Rodríguez Sastoque	
Revisión Financiera	Yecenia Rentería Moreno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad
