

PROYECTO	Construcción intervención y renovación de los parques principales de los municipios de Tarso Angelópolis Valparaíso"
BPIN	2022003050040


PRESUPUESTO				
		CONDICIONES INICIALES		EJECUCION ACTIVIDAD
Ítem	Descripción	Precio Unitario	Valor parcial	Valor parcial
1	Construir, intervenir y renovar parque principal de Angelopolis	2.804.919.941,00	2.804.919.941,00	2.804.919.941,00
2	Construir, intervenir y renovar parque principal de Tarso	2.271.847.799,00	2.271.847.799,00	2.271.847.799,00
3	Construir, intervenir y renovar parque principal de Valparaiso	2.339.727.528,00	2.339.727.528,00	2.339.727.528,00
4	Realizar AIU	1.828.261.764,00	1.828.261.764,00	1.828.261.764,00
5	Implementar plan de manejo ambiental	90.372.780,00	90.372.780,00	90.372.780,00
6	Implementar plan de manejo de transito	70.422.592,00	70.422.592,00	70.422.592,00
7	Implementar plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra (PAPSO)	38.990.702,00	38.990.702,00	38.990.702,00
8	Ejecutar Interventoría	918.795.275,00	918.795.275,00	918.795.275,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO			\$ 10.363.338.381,00	\$ 10.363.338.381,00

VALOR FINAL DEL PROYECTO	
---------------------------------	--

RESUMEN PROYECTO	
VALOR APROBADO OCAD PROYECTO	10.363.338.381,00
VALOR DEL PROYECTO CONTRATADO	10.363.338.381,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	10.363.338.381,00

RESUMEN EJECUCION FISICA	
VALOR EJECUTADO OBRA + SUPERVISION	\$ 6.237.856.857,00
VALOR EJECUTADO PROYECTO	\$ 6.237.856.857,00
% DE AVANCE FISICO	70,72%

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL EJECUTADO	\$ 8.610.654.204,00
EJECUCION FINANCIERA %	78,23%

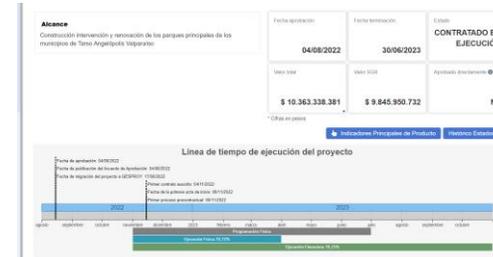

Liliana Escobar Orrego
LILIANA ESCOBAR ORREGO
 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Wilson Osbaldo Barrera Lopez
WILSON OSBALDO BARRERA LOPEZ
 Representante legal
 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PARQUES 2022
