

ANTIOQUIA

PENSANDO EN GRANDE

2016-2019

INSTALACION OCAD DEPARTAMENTAL 2016-2019



SALDOS DISPONIBLES OCAD DEPARTAMENTAL

CONCEPTO	VALOR	
ASIGNADO 2012-2015	\$	123.251.807.356
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$	5.455.542.117
TOTAL	\$	128.707.349.473
APROBADO A 2015	\$	(121.207.332.334)
SALDO DISPONIBLE A 2015	\$	7.500.017.139
PRESUPUESTO 2016	\$	15.164.548.674
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$	22.664.565.813

* Corte 31 de Diciembre de 2015



ANTIOQUIA

PENSANDO EN GRANDE

2016-2019

ESTADO DE LOS PROYECTOS OCAD DEPARTAMENTAL



BPIN 2015003050012

Fortalecimiento del acceso a la educación superior a través de instituciones educativas y la red de parques y ciudadelas educativas de Antioquia


ESTADO DEL PROYECTO

Sin comenzar

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 12.070.552.519	\$ 12.070.552.519	\$ 18.105.812.106
FCR 2015	\$ 3.657.076.003	\$ 3.657.076.003	
FDR 2015	\$ 2.378.183.583	\$ 2.378.183.583	

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050009

Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa del parque educativo La Estrella.



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 96%

AVANCE FINANCIERO: 95,71%


Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 95.383.655	\$ 95.383.655	\$ 95.383.655

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050011

Implementación de estrategias de atención integral en salud nutrición a niños, niñas, madres gestantes y lactantes del Departamento de Antioquia.

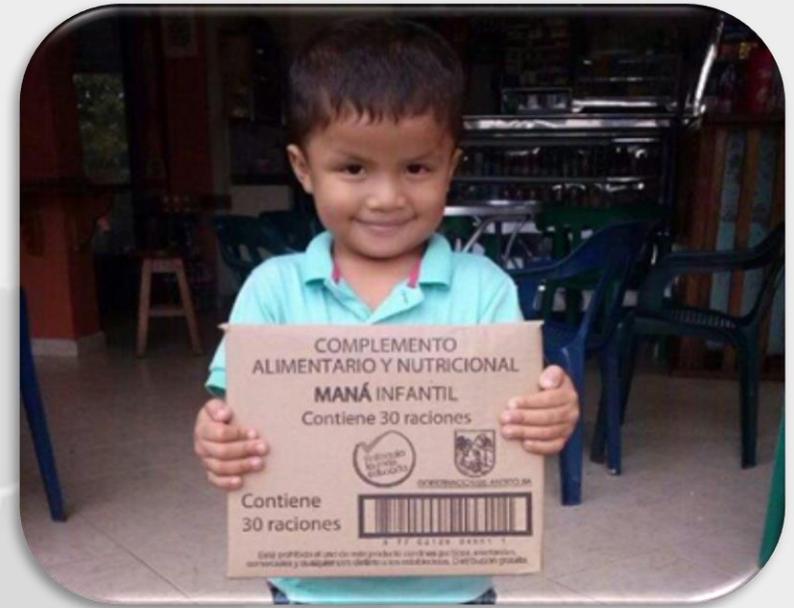

ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 0%
AVANCE FINANCIERO: 5,85%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 23.500.000.000	\$ 23.500.000.000	\$ 23.500.000.000

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050002

Construcción parque educativo el Bagre, Antioquia



ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 91,12%

AVANCE FINANCIERO: 84,89%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 2.691.447.763	\$ 2.691.447.763	\$ 2.828.190.596
Fuentes Departamento	\$ 136.742.833		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050001

Construcción y mejoramiento de ambientes de aprendizaje del establecimiento educativo I.E Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia, Occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 11,66%

AVANCE FINANCIERO: 6,66%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 4.738.492.787	\$ 4.738.492.787	\$ 5.260.426.728
Fuentes Municipio	\$ 521.933.941		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050005

Construcción parque educativo Liborina,
Antioquia


ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 91%

AVANCE FINANCIERO: 81,27%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 2.860.908.660	\$ 2.860.908.660	\$ 3.018.019.414
Fuentes Departamento	\$ 157.110.754		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050006

Construcción parque educativo Arboletes,
Antioquia


ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 81%
AVANCE FINANCIERO: 71,26%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 2.644.620.445	\$ 2.644.620.445	\$ 2.780.954.566
Fuentes Departamento	\$ 136.334.121		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2015003050004

Construcción de obras complementaria de la primera etapa del plan maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Amalfi, Antioquia, Occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 93%


Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2015	\$ 657.674.997	\$ 657.674.997	\$ 783.310.391
Fuentes Municipio	\$ 125.635.394		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2012003050006

Capacitación a estudiantes en formación para el trabajo todo el departamento, Antioquia, Occidente

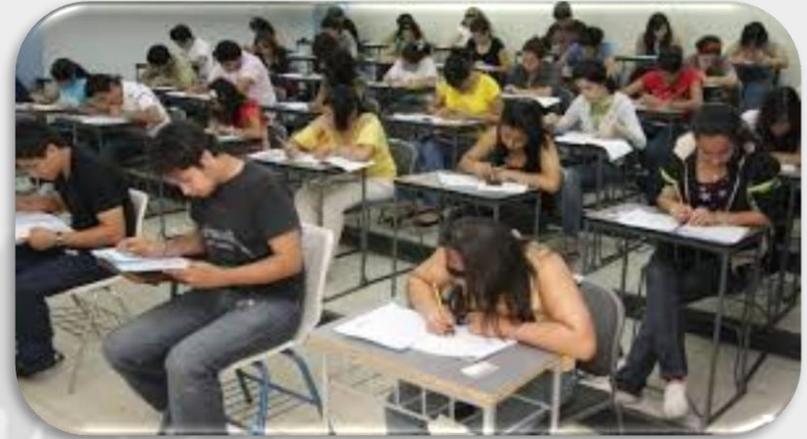

ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 100%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2012	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	\$ 4.325.862.273
Fuentes Departamento	\$ 325.862.273		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2012003050002

Apoyo de la atención integral de la población pobre no cubierta con subsidio en salud en todo el departamento, Antioquia, occidente

**ESTADO DEL PROYECTO**

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 100%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2012	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000	\$ 8.107.626.000
Fuentes Departamento	\$ 107.626.000		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2012003050003

Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, Occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 70%

AVANCE FINANCIERO: 60%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2012	\$ 11.193.725.958	\$ 11.193.725.958	\$ 21.193.725.958
Fuentes Departamento	\$ 4.500.000.000		
Fuentes aliados	\$ 5.500.000.000		

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2012003050005

Implementación de estrategias de atención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, Occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 99,96%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2012	\$ 10.895.500.000	\$ 10.895.500.000	\$ 10.895.500.000

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2013003050001

Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 99,8%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2013 -2014	\$ 25.599.902.000	\$ 31.329.902.069	\$ 29.446.900.000
FCR 2013-2014	\$ 3.846.998.000		
Fuentes Departamento	\$ 1.883.002.069		



*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016

BPIN 2014003050002

Dotación tecnológica y audiovisual para el desarrollo de las actividades de la programación educativa de los parques educativos del Departamento de Antioquia



ESTADO DEL PROYECTO

Ejecución

AVANCE FÍSICO: 84,96%

AVANCE FINANCIERO: 92,5%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2013 -2014	\$ 7.439.120.308	\$ 7.439.120.308	\$ 7.439.120.308

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



BPIN 2014055430001

Construcción del Bloque 1 de la IED los llanos en el municipio de Peque, Antioquia



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 100%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
AD 2013 -2014	\$ 320.003.242	\$ 320.003.242	\$ 718.567.979
FCR (MUNICIPIO)	\$ 322.564.737	\$ 322.564.737	
Fuentes municipio	\$ 76.000.000	\$ 76.000.000	

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de Febrero de 2016



ANTIOQUIA

PENSANDO EN GRANDE

2016-2019

A faint, light gray map of the Antioquia department is visible in the background, showing its various municipalities.

MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD DEPARTAMENTAL 2016



MUNICIPIO DE OLAYA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 473.868.851
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 0
TOTAL	\$ 473.868.851
APROBADO A 2015	\$ (473.868.851)
SALDO DISPONIBLE A 2015	\$ 0
PRESUPUESTO 2016	\$ 105.273.758
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 105.273.758



*Municipio no cuenta con asignaciones directas

BPIN 2014003050001

Rehabilitación del pavimento rígido en la zona urbana del corregimiento de Llanadas en el municipio de Olaya, Antioquia, Occidente

**ESTADO DEL PROYECTO**

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 100%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
FCR 2015	\$ 307.489.031	\$ 307.489.031	\$ 307.489.031

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de febrero de 2016



BPIN 2015003050010

Rehabilitación del pavimento rígido (segunda etapa) en la zona urbana del corregimiento de Llanadas en el municipio de Olaya, Antioquia, Occidente



ESTADO DEL PROYECTO

Terminado

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 100%

Recursos aprobados		Valor SGR	Valor total del proyecto
FCR 2015	\$ 166.379.820	\$ 166.379.820	\$ 166.379.820

*El avance físico y financiero es tomado de GESPROY con corte 29 de febrero de 2016



MUNICIPIO DE CALDAS

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 13.668.172
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 282.293
TOTAL	\$ 13.950.465
PRESUPUESTO 2016	\$ 3.720.348
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 17.670.813

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE ENVIGADO

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 1.010.815
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 168
TOTAL	\$ 1.010.983
PRESUPUESTO 2016	\$ 101.942
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 1.112.925

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE MEDELLIN

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR	
ASIGNADO 2012-2015	\$	108.849.106
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$	10.664.628
TOTAL	\$	119.513.734
PRESUPUESTO 2016	\$	6.558.909
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$	126.072.643

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE SABANETA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 0
SALDO DISPONIBLE A 2015	\$ 0
PRESUPUESTO 2016	\$ 0
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 0



MUNICIPIO DE BARBOSA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 51.069.142
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 0
TOTAL	\$ 51.069.142
PRESUPUESTO 2016	\$ 10.249.139
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 61.318.281

* Información pendiente por parte del municipio.



MUNICIPIO DE GIRARDOTA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 53.997.432
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 208.714
TOTAL	\$ 54.206.146
PRESUPUESTO 2016	\$ 1.995.683
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 56.201.829

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 517.327
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 3.141
TOTAL	\$ 520.468
PRESUPUESTO 2016	\$ 143.654
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 664.122

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE COPACABANA

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 5.135.961
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 54.815
TOTAL	\$ 5.190.776
PRESUPUESTO 2016	\$ 58.966
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 5.249.742

*corte 30 noviembre de 2015.



MUNICIPIO DE ITAGUI

RECURSOS ASIGNADOS

CONCEPTO	VALOR
ASIGNADO 2012-2015	\$ 4.289.287
*RENDIMIENTOS FROS-CUENTA MAESTRA	\$ 0
TOTAL	\$ 4.289.287
PRESUPUESTO 2016	\$ 546.783
SALDO DISPONIBLE A 2016	\$ 4.836.070

* Información pendiente por parte del municipio.



LIBERACIONES DE RECURSOS

El proyecto **Implementación de estrategias de atención y prevención integral a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de todo el departamento, Antioquia, Occidente**

Tipo de Liberación (<i>Total o Parcial</i>)	parcial
Código BPIN	2013003050001
Sector	Salud
Recursos liberados	
Fuente	Valor
Asignaciones Directas	\$ 8.147.098.000

