ANEXO
FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	**ASTRID HELENA BARRERA ROLDAN**
CARGO	Gerente de Servicios Públicos
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	Gobernación de Antioquia
CIUDAD Y FECHA	Medellín, 31 de diciembre de 2015
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	14 de Febrero de 2012
CONDICIÓN DE LA PRESENTACION	Desvinculación
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	01 de enero de 2016

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Este informe da cuenta de la gestión realizada como **Gerente de Servicios Públicos** de la Gobernación de Antioquia desde el **14 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.** En el informe se abordan los aspectos administrativos, técnicos, financieros y contractuales desarrollados; el soporte documental y digital reposan en la oficina Piso 9 – 909, y en los archivos digitales: Infr_MesadeAyuda(\\Antwnas) (V:) – 1137serviciosPub(\\antwnas) (Y:) – Mercurio.

La Gerencia de Servicios Públicos, es una dependencia del Despacho del Gobenador, creada en el año 2008, mediante Ordenanza No. 12 del 14 de Agosto de 2008, Decreto 2575 del 14 de octubre de 2008, por medio de la cual se determina la estructura orgánica de la Administración Departamental del Orden Central, se definen las dependencias que conforman los organismos y se señalan sus funciones.

El 14 de febrero de 2012 se recibió una Gerencia, con **15** servidores y **108** contratos y/o convenios, de los cuales **94** estaban relacionados con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y **14** relacionados con programas de energía - electrificación.

Se identificaron **94** convenios correspondientes a los servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo de las vigencias 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011, distribuidos de la siguiente manera: dos (2) convenios de Aseo, seis (6) convenios de Fortalecimiento, tres (3) de ellos de transferencia de Subsidios y tres (3) de pre inversión e inversión y ochenta y seis (86) convenios de acueducto y alcantarillado.

En el tema contractual encontró **14** convenios de vigencias anteriores, dos (2) de ellos para la Administración y pagos por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- de los recursos asignados por el Departamento de Antioquia, a los municipios para la cofinanciación de proyectos de inversión en electrificación rural por valor de 6.220 millones, seis (6) convenios o contratos para apoyar la construcción o implementación de energías alternativas por valor de 10.000 millones de pesos y seis (6) convenios para la cofinanciación de la construcción de redes eléctricas en diferentes veredas en el Departamento de Antioquia por valor de 15.758 millones.

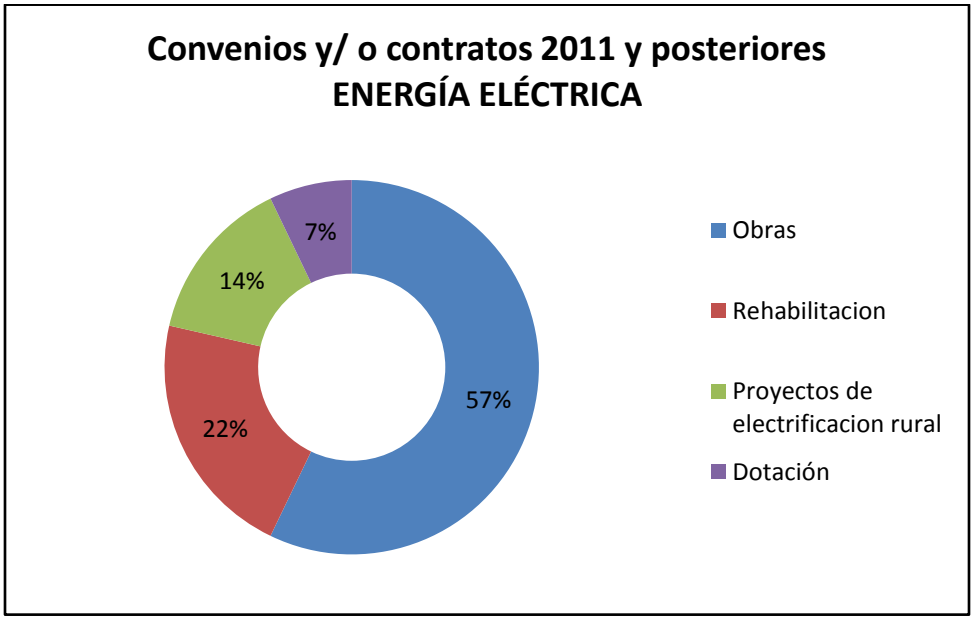

Así mismo fue posible evidenciar que el tema de aseo era liderado desde la Secretaria de Medio Ambiente como un componente ambiental, por lo cual se gestionó su traslado por competencias a la Gerencia de Servicios Públicos en mayo de 2012 adicionalmente se trasladaron dos (2) plazas de profesionales universitarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Lo primero que se realizó fue identificar el estado de los diferentes programas y proyectos que se ejecutaban dentro de la Gerencia de Servicios Públicos y organizarlos de acuerdo a los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo *Antioquia la más educada* 2012 - 2015.

2. Se diseño como herramienta de planeación una matriz de contratación en la cual se identificaron y documentaron los diferentes procesos contractuales, el resultado genero la siguiente información:

   Situación identificada en el mes de febrero de 2012
   - Total convenios y/o contratos **108**
   - Convenios y/o contratos liquidados **78**
   - Convenios y/o contratos en terminados y en liquidación **28**
   - Convenios y/o contratos suspendidos **2**

TABLA No. 1 Situación actual contratos y/o convenios de vigencias anteriores (2006 – 2011) – corte al 31 de diciembre de 2015

TOTAL CONTRATOS / CONVENIOS VIGENCIAS POSTERIORES AL 2012	**98**
LIQUIDADOS	85
POR LIQUIDAR	10
EJECUCIÓN	1
SUSPENDIDOS	1
PROCESO JUDICIAL	1

DETALLE POR CADA AÑO contratos y/o convenios de vigencias anteriores

AÑOS	LIQUIDADOS	POR LIQUIDAR	EJECUCIÓN	SUSPENDIDOS	PROCESO JUDICIAL	TOTAL
2006	4	0	0	0	1	**5**
2007	7	4	0	0	0	**11**
2008	1	0	0	0	0	**1**
2009	12	4	0	1	0	**17**
2010	10	0	0	0	0	**10**
2011	51	2	1	0	0	**54**
TOTAL	**85**	**10**	**1**	**1**	**1**	**98**

3. Posteriormente se evaluaron las situaciones que existían a nivel nacional, departamental, regional y local, encaminadas a ejecutar proyectos cuyo objetivo se relacionaba directamente con el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios:

   - Se identificaron **16** municipios que tenían créditos a través del Plan Carrasquilla.
   - Se identificaron **60** municipios vinculados al Plan Departamental de Agua (Decreto 3200 de 2008 Derogado por el Decreto 2246 de 2012, el cual a su vez fue derogado por el Decreto 1077 de 2015).
   - Se identificaron **35** municipios con operador privado para la prestación de los servicios públicos de acueducto y saneamiento.
   - Se identificó la existencia de **6** empresas regionales donde la Gobernación de Antioquia era socia.
   - Se identificaron **20** municipios cuyo operador es EPM o una filial de EPM.
   - Se identificó un programa exclusivo para la ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica, con el apoyo de EPM – Antioquia Iluminada.
   - Se identificaron dos (2) municipios de Antioquia que son parte del sistema de zonas no interconectados de energía eléctrica (Vigía del Fuerte y Murindo).
   - Se identificaron los Índices de Calidad de agua, coberturas y el estado de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la zona rural y urbana en todos los municipios del departamento (Anuario estadístico 2011).

TABLA No. 2 Empresas regionales de prestación de servicios públicos

EMPRESA	MUNICIPIOS	OBSERVACIONES
EPM	Valle de Aburra (10 municipios)	
Aguas de Occidente	Santafé de Antioquia – San Jerónimo – Sopetran y Olaya	Se aprobó su fusión con Aguas de Urabá – La Gobernación voto negativo
Aguas de Uraba	Mutata, Chigorodo, Apartado, Carepa y Turbo	Se aprobó su fusión con Aguas de Occidente – La Gobernación voto negativo
Empresas Públicas de Oriente – EPO	Zona rural El Retiro y Rionegro	Se aprobó su liquidación - La Gobernación voto negativo
Aguas de Nordeste en liquidación	Segovia, Remedios, Anori y Amalfi	Se encuentra en liquidación
Aguas del Bajo Cauca	Taraza, Cáceres, Caucasia, Nechi, El Bagre y Zaragoza	Pendiente de ingresar a la Asamblea departamental para solicitar autorización
Aguas de Rionegro	Rionegro	Se solicitó un cambio de objeto – La gobernación no participó de ésta decisión.

TABLA No. 3 MUNICIPIOS VINCULADOS AL PLAN CARRASQUILLA.

AUTORIZACIONES GIRO DIRECTO 2009							
No.	**NOMBRE DEL DEPARTAMENTO**	**NOMBRE DEL MUNICIPIO**	**MONTO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**PORCENTAJE**	**DESDE**	**HASTA**
1	ANTIOQUIA	BELLO	28.112,71	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	85%	nov-09	2028
2	ANTIOQUIA	DABEIBA	2695,172	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	46,40%	nov-09	2028
3	ANTIOQUIA	EBÉJICO	2517,952	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	70%	nov-09	2028
4	ANTIOQUIA	RIONEGRO	8582,661	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	85%	nov-09	2028
5	ANTIOQUIA	SABANETA	3069,455	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	59%	nov-09	2028
6	ANTIOQUIA	TARAZÁ	3562,191	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	50%	nov-09	2028
7	ANTIOQUIA	VALDIVIA	3295,972	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	60%	nov-09	2028
AUTORIZACIONES GIRO DIRECTO 2010							
No.	**NOMBRE DEL DEPARTAMENTO**	**NOMBRE DEL MUNICIPIO**		**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**PORCENTAJE**	**DESDE**	**HASTA**
8	ANTIOQUIA	YALÍ	1041,67	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	30%	may-10	2029
9	ANTIOQUIA	CALDAS	6851,92	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	85%	may-10	2029
10	ANTIOQUIA	CARAMANTA	1755,091	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	70%	may-10	2029
11	ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABÁ	2677,114	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	32%	may-10	2029
12	ANTIOQUIA	MUTATÁ	1658,691	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	30%	may-10	2029
13	ANTIOQUIA	ABRIAQUÍ	981,087	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	55,40%	dic-10	2029
14	ANTIOQUIA	CAREPA	2787,654	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	30%	dic-10	2029
AUTORIZACIONES GIRO DIRECTO 2011							
No.	**NOMBRE DEL DEPARTAMENTO**	**NOMBRE DEL MUNICIPIO**		**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**PORCENTAJE**	**DESDE**	**HASTA**
15	ANTIOQUIA	BETANIA	1817,439	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	70%	may-11	2030
16	ANTIOQUIA	ANGOSTURA	2507,427	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	60%	may-11	2030
	TOTAL		73.914,202				

TABLA No. 4 Listado de Operadores y Municipios privados

EMPRESA	MUNICIPIOS	OBSERVACIONES
CONHYDRA	Sonsón Marinilla Santafé de Antioquia Puerto Berrio Chigorodo Mutata Turbo	Santafé de Antioquia se entrega a Aguas de Occidente. Turbo, Chigorodo y Mutata se entregan a Aguas de Uraba. Sonsón creo una Empresa Municipal que se llama Aguas del Paramo y es la encargada de la operación. Marinilla asumió la prestación del servicio con la empresa municipal. Puerto Berrio asumió la prestación con la empresa Aguas del Puerto.
AASA	Anori Amalfi Yali Santa Rosa Ituango San José de la Montaña Puerto Triunfo Bolombolo – Venecia Armenia Titiribi San Pedro de los Milagros Arboletes	Yali, tiene un nuevo operador por 20 años – Empresa de Servicios Públicos de Yali. Ituango asumió la prestación directamente con la empresa municipal. Los demás ampliaron la operación con AASA.
Ingenieria Total	Segovia Ciudad Bolivar Jardín Andes Salgar	Segovia tiene nuevo operador – realizo licitación. Andes asumió la prestación con empresa municipal. Salgar asumió la prestación con empresa municipal. Ciudad Bolívar y Jardín ampliación la operación con Ingenieria Total.
Sistemas públicos	Necocli San Pedro de Uraba	Convenios con otrosí prorrogados 15 años
Operadores de Servicios	Fredonia Santa Barbara Valparaiso Caramanta	Convenios con otrosí prorrogados 15 años
Aguascol	Nechi Caceres Taraza Caucasia	Convenios con otrosí prorrogados 15 años

4. Se evaluó de manera detallada el estado de avance del Plan Departamental de Agua _PDA, y fue posible evidenciar que a diciembre de 2011 se habían realizado las siguientes actividades[1]:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	ESTADO
Apoyar y agilizar la implementación de las estructuras operativas de los PDA	Contar con gerencia asesora	Se adelanto convocatoria pero se declaro desierta
Contar con los instrumentos de planeación formulados y aprobados por el comité directivo	Formular y aprobar el reglamento Comité Directivo, manual operativo,	Ejecutado
Contar con la financiación del PDA	Presentar al Comité Directivo y a las instancias del FIA la modelación financiera del Depertamento	Ejecutado
	Presentar al Comité Directivo y a las instancias del FIA la modelación financiera de los municipios vinculados al PDA	Ejecutado
	Presentar al Comité Directivo y a las instancias del FIA la modelación financiera las corporaciones autónomas vinculadas al PDA	Pendiente
Formalizar la participación de los Municipios en el PDA	Vincular a los Municipios al PDA a través del convenio tripartito	65 Municipios vinculados
Garantizar los aportes comprometidos por lo entes territoriales en el marco de los PDA	Autorizar giro directo del Departamento	Ejecutado
	Autorizar giro directo del 100% de los municipios vinculados al FIA	Parcial. Pendientes algunos municipios
Grantizar la ejecución de obras en el marco del PDA	Desarrollar las actividades previstas para la elaboración de estudios y diseños requeridos.	No se cuentan con diagnósticos confiables
Cumplir con la política nacional de mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el marco de los PDA	Adoptar el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios publicos de agua y sanemaiento y el desarrollo institucional	Pendiente
	Inicial el proceso de fortalecimiento institucional o desarrollo empresarial de los municipios vinculados al PDA	Pendiente

A junio del 2010 se vincularon al PDA de Antioquia 65[2] municipios, sin embargo hasta la fecha no se han adelantado inversiones. La Gobernación estima que se requiere una inversión para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de $846 mil millones de pesos (a precios de 2010), de los cuales $323 mil millones provienen de los PDA. EPM estima que la demanda de recursos asciende a $1.2 billones de pesos.

[1] Información suministrada durante el empalme 2011

[2] Solamente se tenían 60 municipios vinculados a diciembre de 2011

De estos recursos $62 mil millones serían cubiertos por la nación, $192 mil millones por el Departamento ($82 mil millones por el SGP según modelo FIA y $110 mil millones por crédito), $160 mil millones por los municipios (según modelo FIA)[3].

El avance del Programa Aguas para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas PAP - PDA, con corte al 30 de diciembre de 2015 es:

Se vincularon Cuatro (4) nuevos municipios al PAP - PDA: **Donmatias - Alejandría - Abejorral y Toledo.** Hoy se tienen **64** municipios vinculados.

Tabla 5. Municipios vinculados al PAP-PDA Antioquia

MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAP-PDA ANTIOQUIA		
Abejorral	Donmatías	Remedios
Alejandría	El Bagre	Sabanalarga
Amagá	El Santuario	Salgar
Amalfi	Fredonia	San Andrés de Cuerquia
Andes	Frontino	San Francisco
Angelópolis	Giraldo	San José de la Montaña
Anzá	Gómez plata	San Juan de Urabá
Arboletes	Heliconia	San Luis
Argelia	Hispania	San Rafael
Betulia	Ituango	San Roque
Briceño	Jericó	Santa Bárbara
Buriticá	La Ceja	Santa Rosa de Osos
Cáceres	La Pintada	Segovia
Caicedo	Maceo	Sonsón
Campamento	Nariño	Titiribí
Cañasgordas	Nechí	Toledo
Caracolí	Necoclí	Uramita
Carolina del Príncipe	Pueblorrico	Urrao
Caucasia	Puerto Berrío	Vegachí
Cisneros	Puerto Nare	Vigía del Fuerte
Concordia	Puerto Triunfo	Yolombó
TOTAL	**64**	Zaragoza

[3] Información suministrada durante el empalme 2011

Durante este período se han logrado:

23 comités directivos del PDA de los cuales, **15** comités se han realizado entre el 2012 - 2015 (30 diciembre de 2015).
64 municipios tienen proyecto presentado al mecanismo de ventanilla única del MVCT
100 proyectos presentados al mecanismo de ventanilla única del MVCT
86 proyectos viabilizados por el MVCT
41 proyectos ejecutados (Terminados a 30 de diciembre de 2015)
35 proyectos en ejecución (30 de diciembre de 2015)
16 proyectos en evaluación (30 de diciembre de 2015)
5 proyectos en formulación
Se diseño el **Plan de Gestión Social**
Se diseño el **Plan de Fortalecimiento Institucional**
Fue aprobado el **Manual operativo del PAP - PDA**
Fue aprobada la **Matriz de Priorización del PAP - PDA** (Comité 9 del 12 junio de 2012)
En la Tabla No. 6 se resume el estado de los instrumentos de planeación del Plan Departamental de Agua – Programa Aguas para la Prosperidad.

Tabla 6. Estado Actualizado de los Instrumento de Planeación PAP- PDA

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	APROBADO	FECHA	ACTA No	OBSERVACIONES
Manual Operativo del PAP-PDA	SI	17/06/2010	3	Reformulado, ajustado y aprobado en Comité Directivo N°. 12 de acuerdo a la normatividad vigente del Decreto 2246 de 2012, incluyendo modificaciones en: los criterios de distribución de los recursos; el Plan de Acción por Municipio; la ejecución, seguimiento y control del PAP-PDA y los criterios para que el municipio o el prestador se encarguen de la contratación de las obras. La última modificación fue aprobada en Comité Directivo N°22 del 13 de julio de 2015, en donde se incluyó el ítem de Gestión del Riesgo Sectorial como componente del PAP-PDA
Plan General Estratégico y de Inversiones – PGEI	SI	17/06/2010	3	Reformulado, ajustado y aprobado en Comité Directivo N° 12, titulado PGEI 2012-2015. La última modificación fue aprobada en Comité Directivo N° 22 del 13 de julio de 2015.
Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2015	SI	13/07/2015	22	Aprobado en Comité Directivo N° 22 del 13 de julio de 2015.
Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios del PAP-PDA 2013-2015	SI	07/03/2013	12	Aprobado en Comité Directivo N°12 del 7 de marzo de 2013.
Plan de Gestión Social	SI	07/03/2013	12	Aprobado en Comité Directivo N° 12 del 7 de marzo de 2013.
Reglamento Operativo del Comité Directivo del PAP-PDA	SI	10/09/2009	1	Reformulado, ajustado y aprobado en Comité Directivo N° 12 de acuerdo a la normatividad vigente del decreto 2246 de 2012.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	APROBADO	FECHA	ACTA No	OBSERVACIONES
Plan Director Ambiental	No	--	--	En estado de formulación.

Al 31 de diciembre año 2015 el programa Aguas para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas **PAP-PDA,** presenta el siguiente balance técnico, el detalle y las generalidades de los proyectos mostrados en la siguiente tabla puede consultarse en la página web oficial del PAP-PDA: *http://proyectos.pdaantioquia.com/*

Tabla No. 7 ESTADO DE PROYECTOS PAP-PDA _ 30 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE PROYECTO	N° PROYECTOS	N° MUNICIPIOS	PROYECTOS
Ejecutados	41	41	Andes, Angelópolis II, Betulia, Briceño, Caicedo, Campamento, Cañasgordas I, Carolina del príncipe I*, El Santuario, Heliconia, Hispania, Ituango, Jericó, La Ceja del Tambo, Nariño, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios I**, Sabanalarga, Salgar, San José de la Montaña, San Luis, San Roque, Sonsón, todos los contratos se encuentran liquidados. Amagá, Angelópolis I, Anzá, Argelia de María, Buriticá, Cáceres, Carolina del Príncipe II, Fredonia, Maceo, Puerto Berrío II*, Puerto Triunfo II, San Juan de Urabá, San Francisco, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Uramita. En proceso de liquidación. Puerto Berrío Empalmes. En liquidación. *Proyecto formulado por el Gestor y ejecutado por MVCT a través de FINDETER, no se contabiliza para interventoría. **Recursos Gobernación de Antioquia
En ejecución	17	16	Amalfi, Arboletes, Cañasgordas II, Cisneros I, Cisneros* "Adición", Concordia, Donmatías, El Bagre, Giraldo, Gómez Plata II, Necoclí I, Puerto Nare, Remedios II, San Juan de Urabá II, Segovia, Vigía del Fuerte, Yolombó. *Proyecto ejecutado por Findeter con adición del PAP-PDA
Adjudicados	9	9	Amagá II*, Arboletes II, Argelia II, Briceño II, El Santuario II, Urrao, Santa Bárbara, Titiribí, Zaragoza. *No es formulado por el PDA, pero reciben apoyo.
En Proceso de Contratación	9	9	Alejandría (Veredas Tocaima, El Carbón, La Pava y Piedras), Betulia (Corregimiento de Altamira), Caucasia-Cuturú**, Frontino (Corregimiento Nutibara), Giraldo (Corregimiento el Manglar), Nariño II, La Pintada, Puerto Berrío III, Vegachí. **Proyecto ejecutado por MVCT

ESTADO DE PROYECTO	N° PROYECTOS	N° MUNICIPIOS	PROYECTOS
Concepto Técnico Favorable	1	1	Caucasia II (Caño San Miguel).
En proceso de Viabilización	11	11	Abejorral, Andes (Corregimiento de San José), Caracolí, Nechí, Necoclí II (Corregimiento El Totumo), Pueblorrico II, San Andrés de Cuerquia, Salgar II, Santa Rosa de Osos II, San Francisco II, Toledo
Formulación	8	7	Campamento II, Caucasia II (Caño Atascoso), Concordia II (Reformulación), Ceja II, San Roque II, Titiribí II, Zaragoza II, Zaragoza*(Vegas de Segovia, Buenos Aires Palizada, El Pato),
Otros apoyos a Diseño	3	3	El Bagre (Las Brisas y La Colina), Hispania (Reubicación de la PTAR), San José de la Montaña II.
Total	***100***		

5. Se realizó inventario de las infraestructuras relacionadas con la prestación de los servicios públicos en Antioquia (CTA - 2013). Tabla No. 8

Tabla No. 8 Inventario general de las estructuras del departamento de Antioquia

Subregión	Acueductos		Bocatoma		Tanque desarenador		Planta de potabilización		Tanque de almacenamiento	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Antioquia	1846	100	1978	100	1689	100	560	100	1858	100
Bajo Cauca	**29**	**1,6**	**29**	**1,5**	**18**	**1,1**	**12**	**2,1**	**26**	**1,4**
Magdalena Medio	65	3,5	75	3,8	65	3,8	21	3,8	73	3,9
Nordeste	135	7,3	144	7,3	127	7,5	30	5,4	141	7,6
Norte	225	12,2	249	12,6	223	13,2	103	18,4	226	12,2
Occidente	405	21,9	412	20,8	383	22,7	68	12,1	366	19,7
Oriente	458	24,8	507	25,6	412	24,4	170	30,4	463	24,9

Subregión	Acueductos		Bocatoma		Tanque desarenador		Planta de potabilización		Tanque de almacenamiento	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Suroeste	424	23,0	482	24,4	422	25,0	115	20,5	474	25,5
Urabá	105	5,7	80	4,0	39	2,3	41	7,3	89	4,8

Fuente: CTA 2013 - elaboración propia

3. RECURSO HUMANO

La Gerencia de Servicios Públicos contaba en el año 2011 con 15 personas:
Un Gerente (LN) - Dos Directores (LN)

Del Gerente dependen:
1 Asesor de grado 2 (LN)
2 Asesores de grado 1 (LN)
1 Secretario Ejecutivo
1 Profesional Universitario grado 2
1 Profesional especializado grado 5

De la Dirección de Electrificación Rural dependen:
2 Profesionales Universitarios (hay una plaza vacante)

De la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico dependen:
4 Profesionales Universitarios

La Gerencia de Servicios Públicos tiene en el año **2015,** 13 personas:

Un Gerente (LN)
Dos Directores (LN)

Del Gerente dependen 4
De la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico dependen 5
De la Dirección de Electrificación Rural dependen 1

RECURSO HUMANO GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Servidores por Novedad	Despacho Del Gerente	Dirección De Agua Potable Y Saneamiento Básico	Dirección De Electrificación	TOTAL GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Carrera Administrativa		1	1	2
Encargo en vacante definitiva	1	1		2
Libre Nombramiento y Remoción	1	1	1	3
Provisionalidad en vacante definitiva	3	3		6
Total general	**5**	**6**	**2**	**13**

POR NIVEL	
Asesor	0
Asistencial	0
Directivo	3
Profesional	9
Técnico	1
TOTAL	13

Por tipo de cargo	Nro.
Carrera Administrativa	10
Libre Nombramiento y Remoción	3
Total general	13

4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros: Esta información es competencia exclusiva de la Secretaria de Hacienda.

B. Bienes Muebles e Inmuebles

Tabla No. 9. PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO 2012

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2012	$ 47.829.283.637	$ 39.477.788.596	82,5%

DESTINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	$ 1.289.402.651	$ 816.449.355	63,3%
INVERSION	**$ 46.539.880.986**	**$ 38.661.339.241**	**83,1%**

DESTINACION INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
PAP-PDA	$ 32.983.999.131	$ 32.983.999.131	100,0%
Electrificación	$ 3.245.564.159	$ 1.322.552.000	36,0%
Agua Potable y Saneamiento Básico	$ 6.716.107.005	$ 2.415.571.143	40,7%
Municipios Descertificados	$ 3.594.210.691	$ 1.939.216.967	54,0%
TOTAL	**$ 46.539.880.986**	**$ 38.661.339.241**	**83,1%**

El presupuesto asignado a la Gerencia de Servicios Públicos fue de $47.829.283.637 de los cuales el 97,30% corresponde a Inversión y el 2,70% a funcionamiento.

FUENTE: Sistema SAP

Para los recursos de inversión se tiene los siguientes porcentajes de participación.

-PAP-PDA 70%

-Electrificación 7%

-Agua Potable y Saneamiento Básico 14%

-Municipios Descertificados 8% (4 municipios)

Tabla No. 10 Presupuesto Municipios Descertificados 2012

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
El Santuario	569.854.069,00	172.898.318,00	30%
Itúango	1.323.137.912,00	649.622.322,00	49%
La Pintada	411.154.084,00	281.859.635,00	69%
Sonsón	1.290.064.626,00	834.836.692,00	65%
Totales	**$ 3.594.210.691,00**	**$ 1.939.216.967**	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2012

Para la presente vigencia la Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de reservas presupuestales por un valor de $892.992.383 así:

Tabla No. 11 Reservas presupuestales 2012

CONCEPTO	VALOR	CONTRATO
REGALIAS	$ 718.992.469	2011CF370110
CONTRATOS	$ 173.999.914	2010CC370068
		2011CF370159

Tabla No. 12 PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO 2013

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2013	$ 69.348.426.640	$ 62.164.970.329	89,6%

DESTINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	$ 1.136.446.230	$ 966.370.651	85,0%
INVERSION	**$ 68.211.980.410**	**$ 60.281.137.358**	**88,4%**

DESTINACION INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
PAP-PDA	$ 30.496.169.518	$ 30.495.898.385	100,0%
Electrificación	$ 5.963.902.093	$ 5.388.492.332	90,4%
Agua Potable y Saneamiento Básico	$ 22.025.158.972	$ 20.214.084.657	91,8%
Municipios Descertificados	$ 9.726.749.827	$ 4.182.661.984	43,0%
TOTAL	**$ 68.211.980.410**	**$ 60.281.137.358**	**88,4%**

El presupuesto asignado a la Gerencia de Servicios Públicos fue de $69.348.426.640 de los cuales el 98,36% corresponde a Inversión y el 1,64% a funcionamiento.

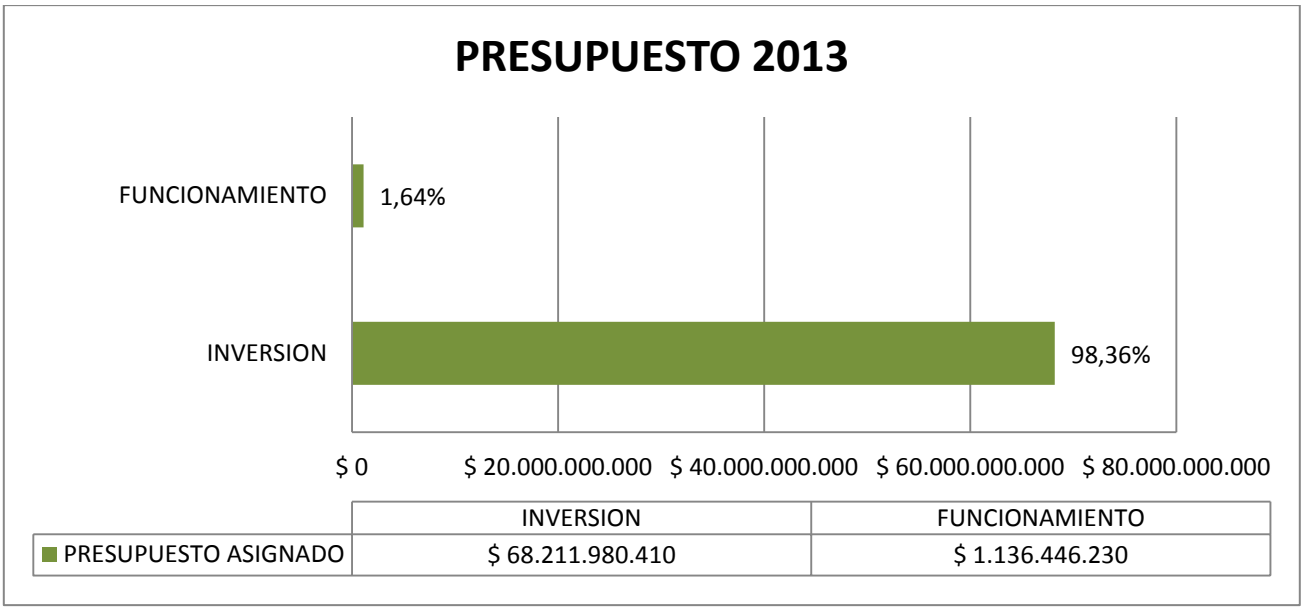

FUENTE: Sistema SAP

Para los recursos de inversión se tiene los siguientes porcentajes de participación.

-PAP-PDA 45%

-Electrificación 9%

-Agua Potable y Saneamiento Básico 32%

-Municipios Descertificados 14% (23 municipios)

Tabla No. 13 Presupuesto Municipios Descertificados 2013

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Angelópolis	177.146.851,00	118.789.553	67%
Anzá	462.235.449,00	217.124.701	47%
Argelia	466.326.462,00	231.356.863	50%
Cáceres	688.155.219,00	177.337.207	26%
Caldas	970.355.055,00	906.260.704	93%
Cisneros	313.376.959,00	154.060.903	49%
Envigado	460.380.615,00	287.771.202	63%
Gómez Plata	515.151.477,00	188.981.904	37%

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Itúango	20.895.459,00	0	0%
La Estrella	19.752.543,00	0	0%
La Pintada	51.128.129,00	0	0%
Murindó	619.355.293,00	126.249.996	20%
Nariño	364.894.907,00	102.733.793	28%
Puerto Berrío	802.660.842,00	253.594.053	32%
San Rafael	83.920.960,00	0	0%
San Roque	250.736.348,00	174.054.669	69%
Sonsón	1.151.799.946,00	52.459.404	5%
Sopetrán	207.477.043,00	81.927.210	39%
Tarazá	657.570.668,00	589.516.586	90%
Toledo	347.958.923,00	5.888.161	2%
Uramita	355.639.869,00	145.065.452	41%
Vigía del Fuerte	221.778.774,00	98.820.704	45%
Zaragoza	518.052.035,00	270.668.916	52%
Totales	**$ 9.726.749.826,00**	**$ 4.182.661.981,00**	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2013

Para la presente vigencia la Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de reservas presupuestales de funcionamiento por un valor de **$ 930.965=**

Tabla No. 14 PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO 2014

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2014	$ 62.440.288.660	$ 52.615.730.499	84,3%

DESTINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	$ 1.282.670.000	$ 995.879.454	77,6%
INVERSION	**$ 61.157.618.660**	**$ 49.643.603.582**	**81,2%**

DESTINACION INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
PAP-PDA	$ 25.620.172.584	$ 25.619.887.870	100,0%
Electrificación	$ 6.387.444.543	$ 6.232.191.882	97,6%
Agua Potable y Saneamiento Básico	$ 16.242.086.085	$ 14.401.608.003	88,7%
Municipios Descertificados	$ 12.907.915.448	$ 3.389.915.827	26,3%
TOTAL	**$ 61.157.618.660**	**$ 49.643.603.582**	**81,2%**

El presupuesto asignado a la Gerencia de Servicios Públicos fué de $62.440.288.660= de los cuales el 97,95% corresponde a Inversión y el 2,05% a funcionamiento.

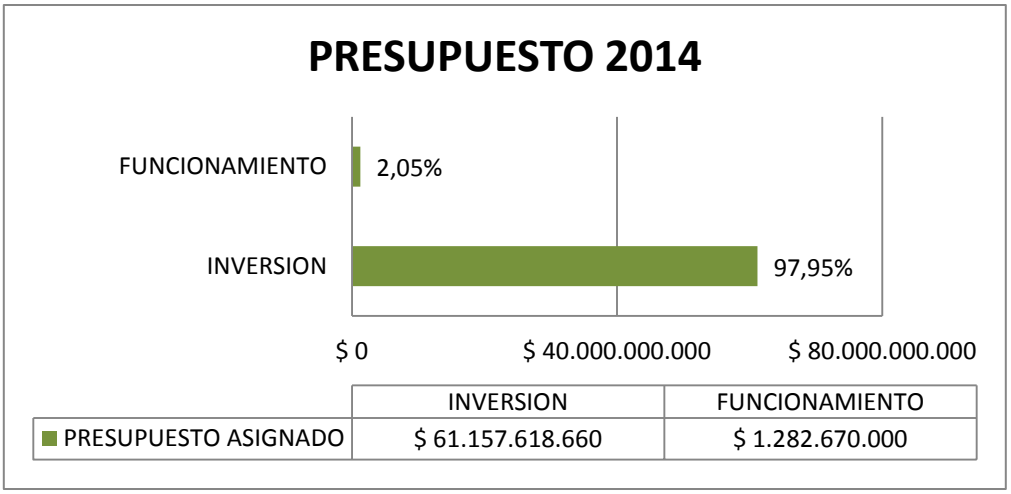

FUENTE: Sistema SAP

Para los recursos de inversión se tiene los siguientes porcentajes de participación.

-PAP-PDA 42%

-Electrificación 10%

-Agua Potable y Saneamiento Básico 27%

-Municipios Descertificados 21% (27 municipios)

Tabla No. 15 Presupuesto Municipios Descertificados 2014

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Abriaquí	101.809.998		0%
Alejandría	137.557.002		0%
Angelópolis	479.146.209	170.389.474	36%
Anzá	878.655.982	220.467.271	25%
Armenia	156.677.754		0%
Caicedo	234.238.095		0%
Campamento	319.748.630		0%
El Santuario	19.481.189		0%
Gómez Plata	1.031.889.302	757.836.882	73%
Itüango	30.194.096		0%
La Estrella	19.752.543		0%
La Pintada	52.408.406		0%
Murindó	1.162.319.604	230.163.472	20%
Mutatá	504.691.956		0%
Nariño	1.462.333.514	434.116.676	30%
Nechi	333.401.220		0%
Olaya	138.859.500		0%
San Francisco	101.622.951		0%
San José de la Montaña	30.626.916		0%
San Rafael	83.927.292		0%
Sonsón	972.163.223		0%

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Támesis	118.754.196		0%
Toledo	9.675.954	9.675.954	100%
Turbo	2.041.234.168		0%
Uramita	20.877.884	20.877.884	100%
Vigía del Fuerte	829.694.257	316.055.177	38%
Zaragoza	1.636.173.607	1.230.333.037	75%
Totales	**12.907.915.448**	**3.389.915.827**	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2014

Para la presente vigencia la Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de reservas presupuestales por un valor de $ 917.462.320= así:

Tabla No. 16 Reservas presupuestales de 2014

CONCEPTO	VALOR	CONTRATO
FONDO 0-1010	$ 145.113.563	4600001107 acta 4
FONDO 0-8110	$ 471.525.285	4600000933 acta 2
		460000942 acta 2
		4600000993 acta 2
FONDO 4-2020	$ 142.734.516	4600000864 acta 2
FONDO 4-2506	$ 158.088.956	4600000737 acta 1
		4600001206 acta 1
TOTAL	$ 917.462.320	

Tabla No. 17 PRESUPUESTO Y EJECUCION AÑO 2015 corte 28 de diciembre

AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2015	$ 64.818.536.814	$ 44.959.944.237	69,4%

DESTINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
INVERSION	**$ 63.474.029.414**	**43.883.781.840**	**69,1%**
FUNCIONAMIENTO	$ 1.344.507.400	$ 1.076.162.397	80,0%

DESTINACION INVERSION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
PAP-PDA	$ 26.530.513.982	$ 26.530.513.982	100,0%
Electrificación	$ 7.089.182.351	$ 3.198.422.501	45,1%
Agua Potable y Saneamiento Básico	$ 12.648.536.571	$ 8.362.453.115	66,1%
Municipios Descertificados	$ 17.205.796.510	$ 5.792.392.242	33,7%
TOTAL	**$ 63.474.029.414**	**$ 43.883.781.840**	**69,1%**

El presupuesto asignado a la Gerencia de Servicios Públicos fue de $64.818.536.814= de los cuales el 97,93% corresponde a Inversión y el 2,07% a funcionamiento.

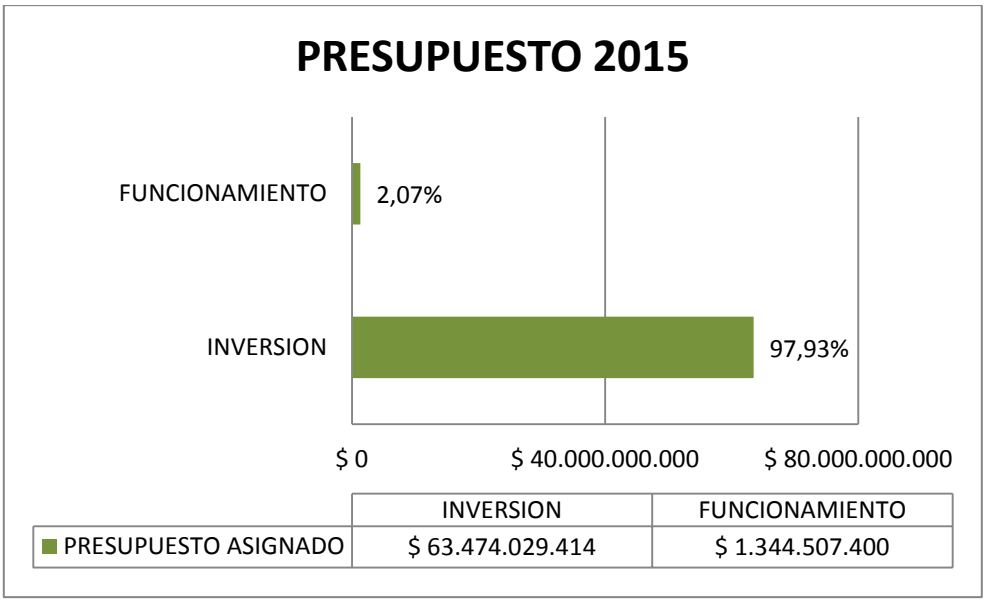

FUENTE: Sistema SAP

PAP-PDA 42%

Electrificación 11%

Agua Potable y Saneamiento Básico 20%

Municipios Descertificados 27% (20 municipios)

Tabla No. 18 Presupuesto Municipios Descertificados 2015

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Abriaquí	257.394.030	144.558.282	56%
Alejandría	596.299.420	236.462.864	40%
Angelópolis	32.513.225	32.513.225	100%
Anzá	1.192.521.166	218.940.498	18%
Armenia	554.398.335	114.705.434	21%
Campamento	1.295.319.028	552.563.252	43%
Gómez Plata	919.569.569	436.152.678	47%
Itüango	41.504.247	0	0%
Jardín	297.219.171	30.738.338	10%

Municipio Descertificado	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Murindó	1.597.675.129		0%
Mutatá	1.635.739.171	885.212.445	54%
Nariño	1.823.940.532	507.675.563	28%
Nechi	1.707.499.209	888.738.701	52%
San Francisco	25.715.883	25.715.883	100%
San José de la Montaña	221.854.836	143.670.668	65%
Santa Rosa de Osos	447.672.638	59.542.231	13%
Sonsón	992.569.759	-	0%
Támesis	616.988.329	430.573.342	70%
Vigía del Fuerte	1.112.976.500	299.962.787	27%
Zaragoza	1.836.426.333	784.666.051	43%
Totales	**17.205.796.510**	**5.792.392.242**	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

Para la presente vigencia la Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de reservas presupuestales por un valor de $1.500.651.048= así:

Tabla No. 19 Reservas presupuestales de 2015

FONDO	VALOR	CONTRATO
0-8051	$ 778.249.411	4600001937
0-8051	$ 180.398.084	4600001986
4-2030	$ 51.295.671	4600002657
0-1010	$ 31.404.838	4600002200
4-2020 / 0-1010	$ 14.837.065	4600002211
0-2506	$ 182.599.402	4600002056
0-3053	$ 62.927.866	4600002076
0-2030	$ 15.850.900	4600002062

FONDO	VALOR	CONTRATO
0-2030	$ 51.935.891	4600001944
0-8051	$ 99.831.744	2014SS220007
0-1010	$ 31.320.176	2014SS370001
TOTALES	$ 1.500.651.048	

CONSOLIDADOS AÑOS 2012 - 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 20 CONSOLIDADO PRESUPUESTO TOTAL 2012-2015

CONSOLIDADO PRESUPUESTO TOTAL 2012-2015			
AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2012	$ 47.829.283.637	$ 39.477.788.596	82,5%
2013	$ 69.348.426.640	$ 62.164.970.329	89,6%
2014	$ 62.440.288.660	$ 52.615.730.499	84,3%
2015	$ 64.818.536.814	$ 44.959.944.237	69,4%
TOTAL	$ 244.436.535.751	$ 199.218.433.661	81,5%

Presentando una ejecución acumulada total de $199.218.433.661 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 81,5%.

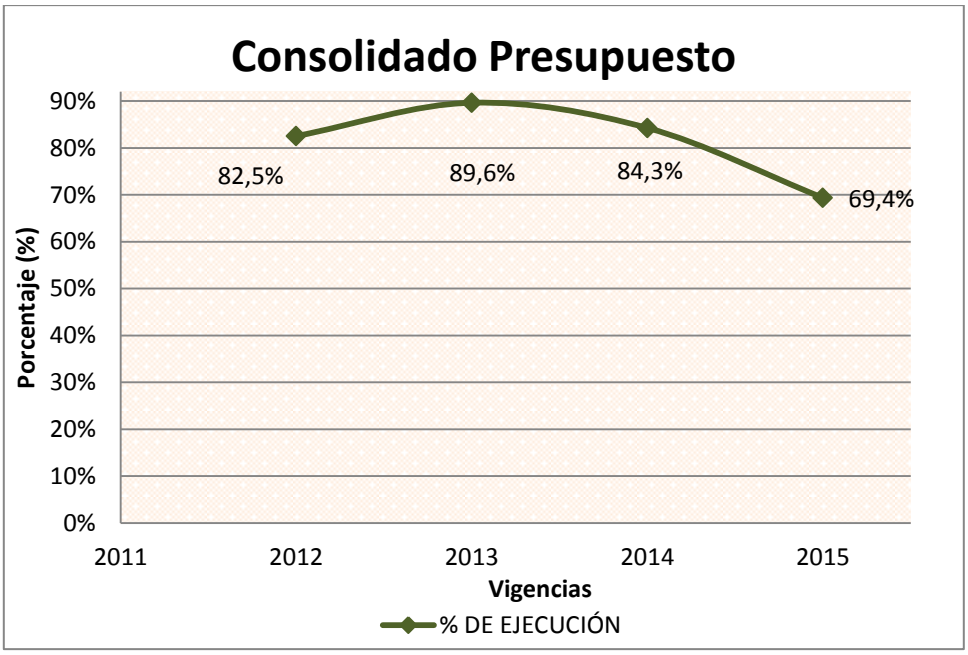

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 21 CONSOLIDADO FUNCIONAMIENTO 2012-2015

CONSOLIDADO FUNCIONAMIENTO 2012-2015			
AÑO	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**EJECUCION**	**% DE EJECUCION**
2012	$ 1.289.402.651	$ 816.449.355	63,3%
2013	$ 1.136.446.230	$ 966.370.651	85,0%
2014	$ 1.282.670.000	$ 995.879.454	77,6%
2015	$ 1.344.507.400	$ 1.076.162.397	80,0%
TOTAL	$ 5.053.026.281	$ 3.854.861.857	76,3%

Presentando una ejecución acumulada por funcionamiento de $3.854.861.857 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 76,3%.

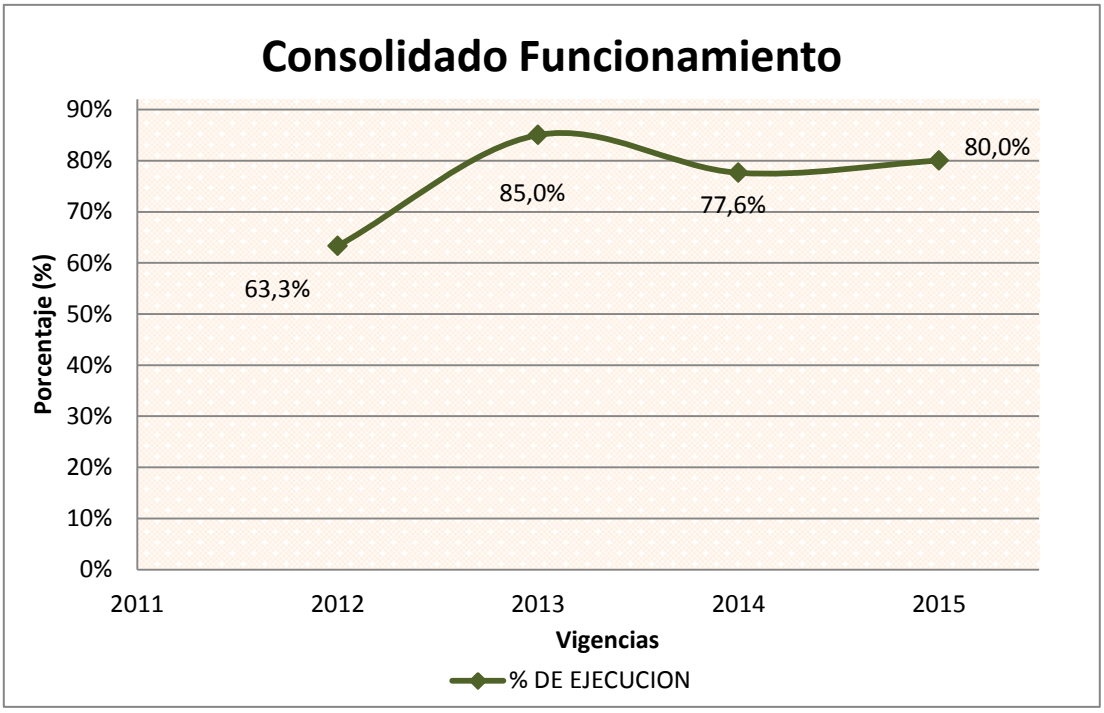

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 22 CONSOLIDADO INVERSION 2012-2015

CONSOLIDADO INVERSION 2012-2015			
AÑO	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**EJECUCION**	**% DE EJECUCION**
2012	$ 46.539.880.986	$ 38.661.339.241	83,1%
2013	$ 68.211.980.410	$ 60.281.137.358	88,4%
2014	$ 61.157.618.660	$ 49.643.603.582	81,2%
2015	$ 63.474.029.414	$ 43.883.781.840	69,1%
TOTAL	$ 239.383.509.470	$ 192.469.862.021	80,4%

Presentando una ejecución acumulada de inversión de $192.469.862.021 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 80,4%.

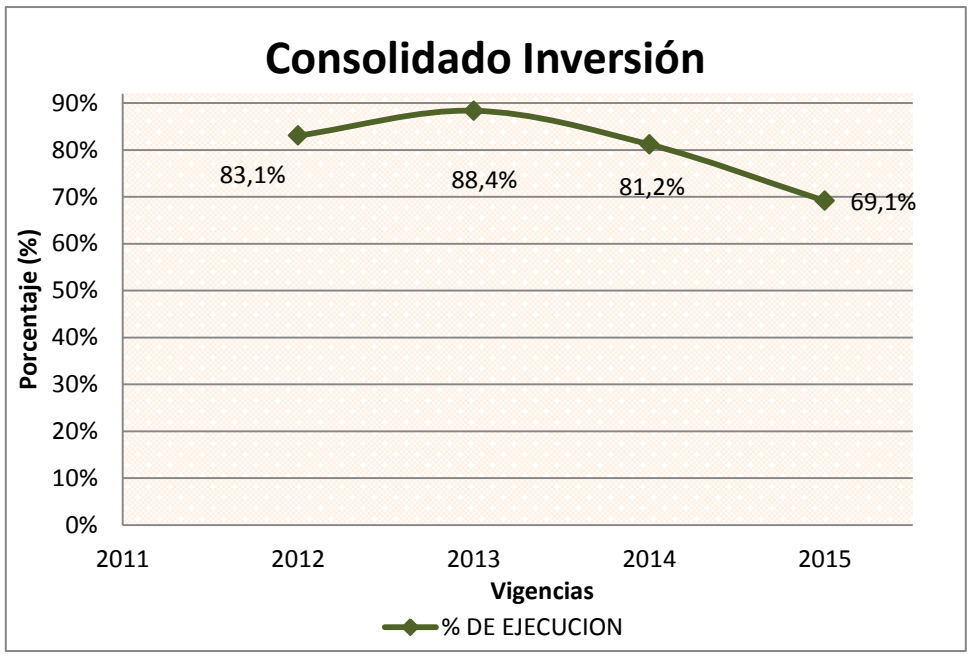

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PAP-PDA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 23 CONSOLIDADO PAP-PDA 2012-2015

CONSOLIDADO PAP-PDA 2012-2015			
AÑO	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**EJECUCION**	**% DE EJECUCION**
2012	$ 32.983.999.131	$ 32.983.999.131	100,0%
2013	$ 30.496.169.518	$ 30.495.898.385	100,0%
2014	$ 25.620.172.584	$ 25.619.887.870	100,0%
2015	$ 26.530.513.982	$ 26.530.513.982	100,0%
TOTAL	$ 115.630.855.215	$ 115.630.299.368	100,0%

Presentando una ejecución acumulada del PAP-PDA de $108.944.260.387 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 94,2%.

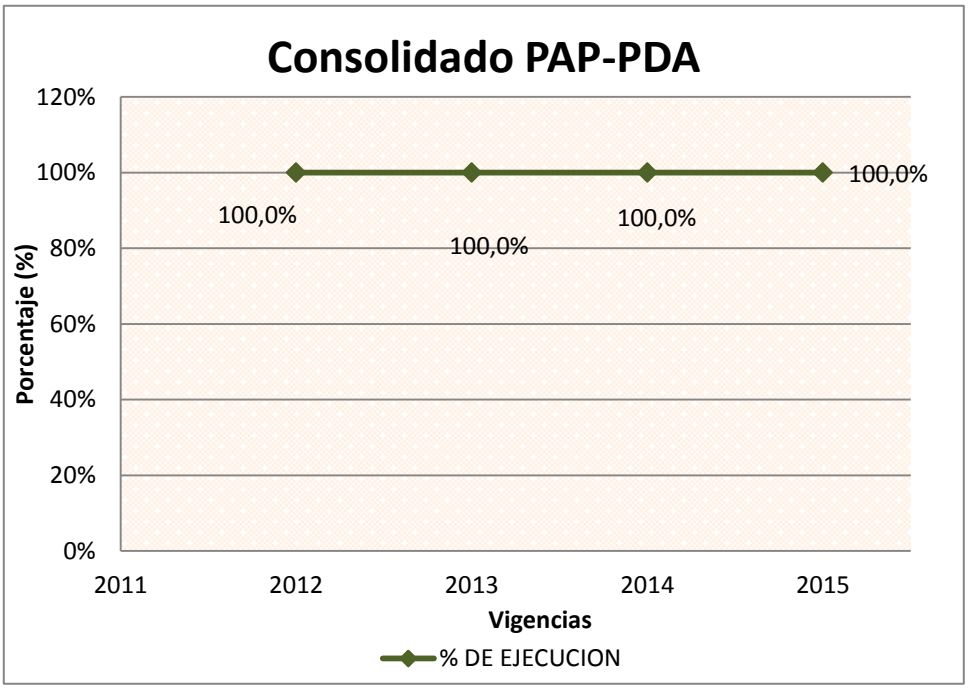

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ELECTRIFICACION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 24 CONSOLIDADO ELECTRIFICACION 2012-2015

CONSOLIDADO ELECTRIFICACION 2012-2015			
AÑO	**PRESUPUESTO ASIGNADO**	**EJECUCION**	**% DE EJECUCION**
2012	$ 3.245.564.159	$ 1.322.552.000	36,0%
2013	$ 5.963.902.093	$ 5.388.492.332	90,4%
2014	$ 6.387.444.543	$ 6.232.191.882	97,6%
2015	$ 7.089.182.351	$ 3.198.422.501	45,1%
TOTAL	$ 22.686.093.146	$ 16.141.658.715	71,2%

Presentando una ejecución acumulada de Electrificación por $16.141.658.715 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 71,2%.

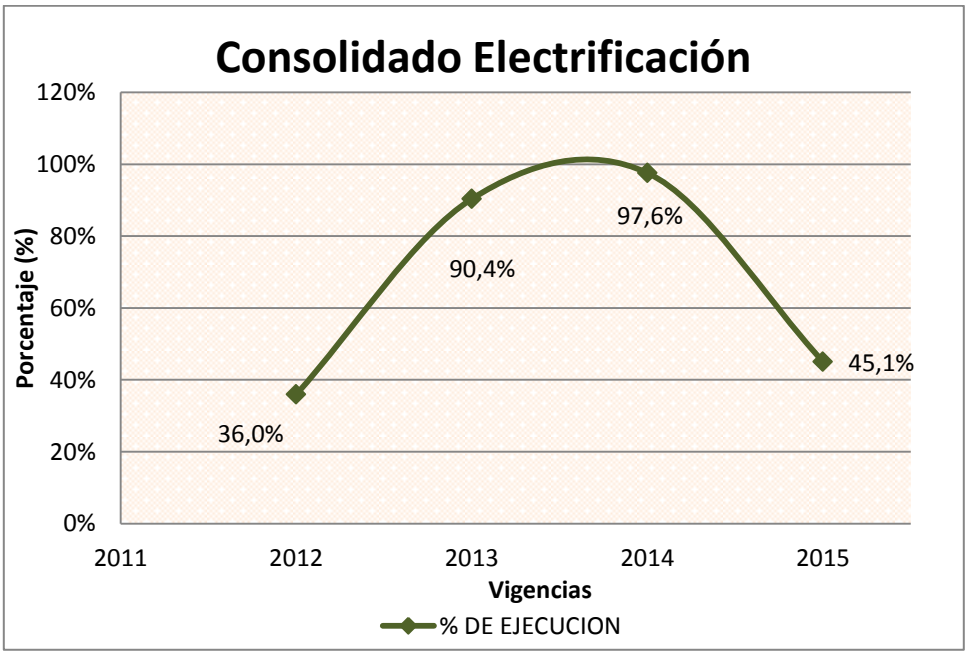

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 25 CONSOLIDADO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2012-2015

CONSOLIDADO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2012-2015			
AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2012	$ 6.716.107.005	$ 2.415.571.143	40,7%
2013	$ 22.025.158.972	$ 20.214.084.657	91,8%
2014	$ 16.242.086.085	$ 14.401.608.003	88,7%
2015	$ 12.648.536.571	$ 8.362.453.115	66,1%
TOTAL	$ 189.873.419.877	$ 108.285.408.388	57,0%

Presentando una ejecución acumulada de Agua Potable y Saneamientos Básico de $103.372.509.530 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 57%.

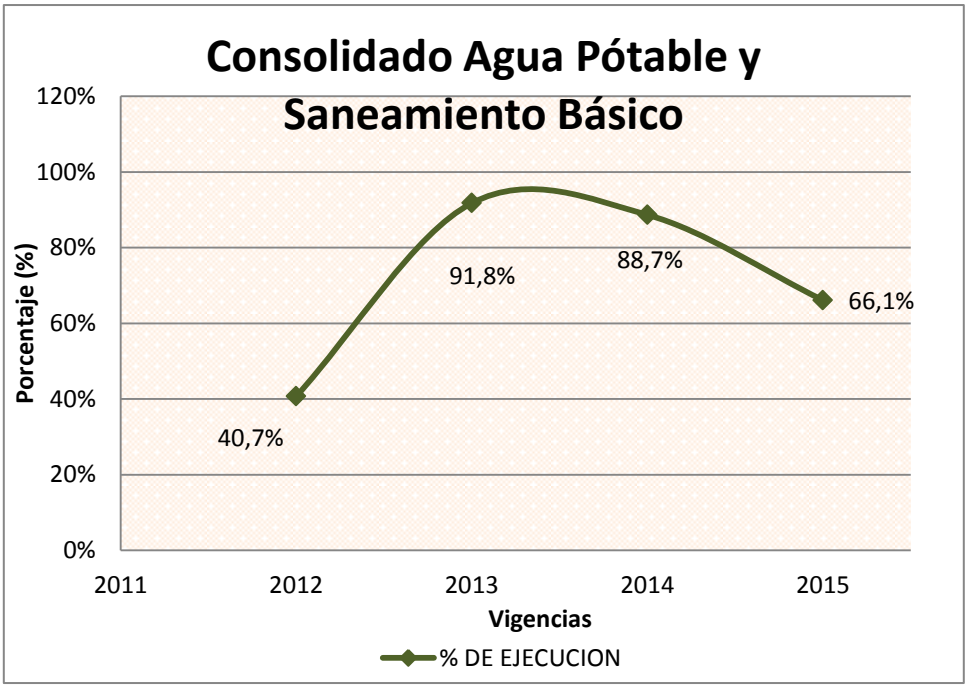

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIA 2012-2015

Tabla No. 26 CONSOLIDADO MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 2012-2015

CONSOLIDADO MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 2012-2015			
AÑO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCION	% DE EJECUCION
2012	$ 3.594.210.691	$ 1.939.216.967	54,0%
2013	$ 9.726.749.827	$ 4.182.661.984	43,0%
2014	$ 12.907.915.448	$ 3.389.915.827	26,3%
2015	$ 17.205.796.510	$ 5.792.392.242	33,7%
TOTAL	$ 43.434.672.476	$ 15.304.187.020	35,2%

Presentando una ejecución acumulada de los Municipios Descertificados de $15.304.187.020= que corresponde a un porcentaje de ejecución del 35,2%.

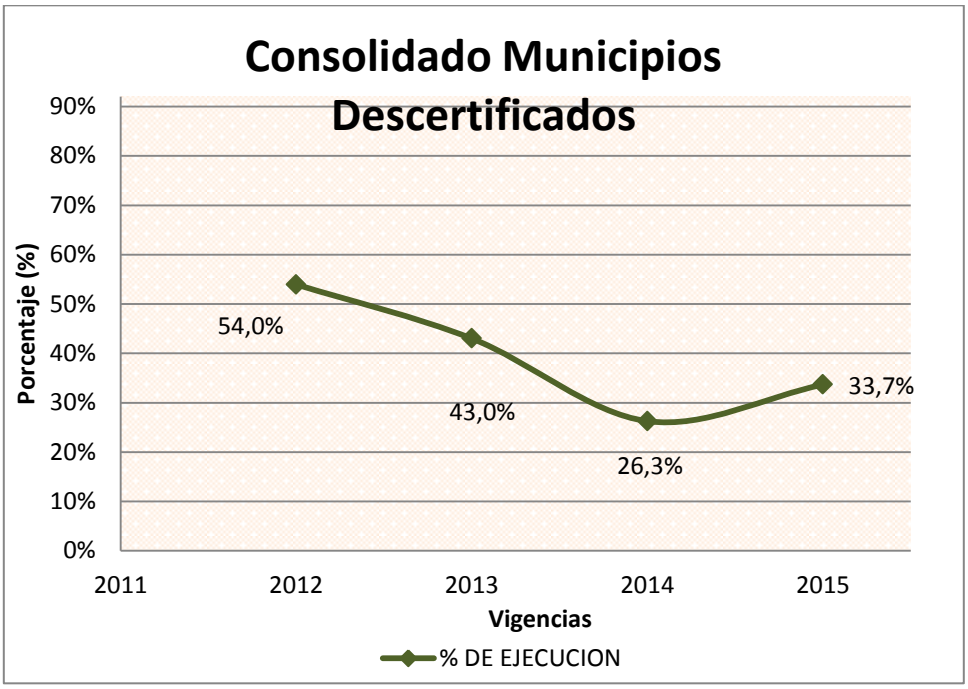

RESERVAS PRESUPUESTALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2012 - 2015

Para la vigencia 2012 – 2015 la Secretaría de Hacienda autorizó la constitución de reservas presupuestales por un valor de $3.312.036.716

Tabla No. 27 CONSOLIDADO RESERVAS PRESUPUESTALES

CONSOLIDADO RESERVAS PRESUPUESTALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS PERIODO 2012 - 2015				
AÑO	2012	2013	2014	2015
VALOR	$ 892.992.383	$930.965	$917.462.320	$1.500.651.048

INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS

Descertificados vigencia 2010 con efectos 2012:

1. Sonsón
2. Santuario
3. Ituango
4. La Pintada

Descertificados vigencia 2011 con efectos 2013:

1. Angelópolis
2. Anzá
3. Argelia
4. Cacéres
5. Caldas
6. Cisneros
7. Envigado
8. Gómez Plata
9. Murindó
10. Nariño
11. Puerto Berrío
12. San Roque
13. Sopetrán
14. Tarazá
15. Toledo
16. Uramita
17. Vigía del Fuerte
18. Zaragoza

Descertificados vigencia 2012 con efectos 2014:

1. Angelópolis
2. Anzá
3. Gómez Plata
4. Murindó
5. Vigia del Fuerte
6. Zaragoza
7. Nariño
8. Abriaquí
9. Alejandría
10. Armenia
11. Mutatá

12. Olaya
13. Caicedo
14. Campamento
15. Turbo
16. Nechí
17. San Francisco
18. Tamesis
19. San José de la Montaña

Descertificados vigencia 2013 con efectos 2015:
1. Anzá
2. Gómez Plata
3. Murindó
4. Vigia del Fuerte
5. Zaragoza
6. Nariño
7. Abriaquí
8. Alejandría
9. Armenia
10. Mutatá
11. Campamento
12. Nechí
13.Tamesis
14. San José de La Montaña
15. Jardín
16. Santa Rosa de Osos

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó a la gobernación de Antioquia el riesgo de descertificación de los municipios del departamento vigencia 2014 con efectos 2016; los municipios que tienen ese riesgo y sus causas se relacionan en la **Tabla No. 27.**

Cada municipio fue notificado de la posible descertificación y de las causas que pueden llevar a ella.

5. PLANTA DE PERSONAL:

APELLIDOS Y NOMBRE	GRADO	NUC	Empleo	GRUPO ACTUAL DE TRABAJO	TIPO DE VINCULACIÓN
	3	2000003371	Gerente	Grupo Servicios Públicos	Libre nombramiento y remoción
Vargas Montes Isabel Cristina	2	2000003377	Director Administrativo	Grupo Servicios Públicos	Libre nombramiento y remoción
España Pulido Oscar Orlando	2	2000003382	Director Administrativo	Grupo Servicios Públicos	Libre nombramiento y remoción
Salinas Zaira	2	2000004301	Profesional Universitario	Despacho del Gerente	Provisionalidad en Vacante Definitiva
Vacante	5	2000004302	Profesional Especializado	Despacho del Gerente	Vacante renuncia 29 de diciembre de 2015
Bedoya Gallego Elsa Victoria	2	2000003383	Profesional Universitario	Electrificación	Carrera Administrativa
Arredondo Ceballos Leidy	2	2000004003	Profesional Universitario	Agua Potable y Saneamiento Básico	Provisionalidad en Vacante Definitiva
Gallo Solórzano Martha Cecilia	2	2000003163	Profesional Universitario	Agua Potable y Saneamiento Básico	Provisionalidad en Vacante Definitiva
Martínez Vera Luis Eduardo	5	2000003381	Profesional Especializado	Agua Potable y Saneamiento Básico	Provisionalidad en Vacante Definitiva
Aguilar Victor Manuel	2	2000003379	Profesional Universitario	Agua Potable y Saneamiento Básico	Carrera Administrativa (Encargo)
Villa Sánchez Francisco Javier	2	2000003378	Profesional Universitario	Agua Potable y Saneamiento Básico	Carrera Administrativa
Carvajal Porras Henry Nelson	1	2000005932	Técnico operativo	Despacho del Gerente	Carrera Administrativa (Encargo)
Arango Gil Alethia Carolina	2	2000006334	Profesional Universitario	Despacho del Gerente	Provisionalidad en vacante definitiva

Tabla No. 27 Detalle de los municipios en riesgo de descertificación vigencia 2014 con efectos año 2016

MUNICIPIO	FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN Y COBERTURAS 2014	CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CPE	ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PORCENAJES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONE	REPORTE EN EL FUT DEL PAGO DE SUBSIDIOS	AGOTAMIENTO DEL ART. 6 LEY 142	ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS	REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI (%)	ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	MATERIALIZACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	TOTAL
Abejorral		1	1								2
Abriaqui						1	1	1			3
Alejandría	1	1	1			1	1	1			6
Angostura			1								1
Anorí			1		1	1	1	1			5
Anzá	1	1									2
Apartadó		1	1								2
Arboletes		1									1
Belmira		1	1								2
Briceño			1								1
Buriticá	1	1									2
Cáceres		1									1
Caicedo		1									1
Caldas		1									1
Campamento	1	1									2
Cañasgordas			1								1
Caracolí		1	1								2
Caramanta		1									1
Carepa		1									1
Chigorodó			1								1
Cisneros					1	1	1	1			4
Ciudad bolívar	1	1									2
Concepción		1						1			2
Concordia		1									1
Dabeiba			1								1
Donmatías		1	1								2
El carmen de viboral		1									1
El peñol		1									1
El retiro		1									1
El santuario		1									1

MUNICIPIO	FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN Y COBERTURAS 2014	CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CPE	ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PORCENAJES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONE	REPORTE EN EL FUT DEL PAGO DE SUBSIDIOS	AGOTAMIENTO DEL ART. 6 LEY 142	ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS	REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI (%)	ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	MATERIALIZACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	TOTAL
Envigado	1		1								2
Guarne		1									1
Guatape		1									1
Heliconia		1	1								2
Hispania		1									1
Ituango		1	1								2
Maceo		1									1
Murindó		1	1					1	1	1	5
Mutatá		1									1
Nariño								1			1
Nechí	1	1	1			1	1	1	1	1	8
Necoclí	1										1
Puerto berrío				1							1
Puerto triunfo			1								1
San andrés de cuerquia				1							1
San francisco		1									1
San jerónimo		1									1
San josé de la montaña		1	1					1			3
San juan de urabá					1	1	1	1	1	1	6
Santa rosa de osos			1								1
Santo domingo			1								1
Segovia		1	1								2
Sonsón			1								1
Sopetrán		1	1								2
Tarazá		1									1
Tarso	1										1
Toledo	1	1		1							3
Turbo		1									1
Urrao		1									1
Valdivia		1									1
Valparaiso	1	1	1								3
Vegachí		1	1								2

MUNICIPIO	FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN Y COBERTURAS 2014	CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CPE	ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PORCENAJES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONE	REPORTE EN EL FUT DEL PAGO DE SUBSIDIOS	AGOTAMIENTO DEL ART. 6 LEY 142	ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS	REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI (%)	ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	MATERIALIZACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO	TOTAL
Venecia		1									1
Vigía del fuerte						1	2			1	4
Yalí		1									1
Yolombó			1								1

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia determina: "*los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita*"[4]. Además, el artículo 367 establece que *"(…) Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación* (…)"[1].

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 142 de 1994[5], la intervención del Estado en los servicios públicos tiene entre otras finalidades: garantizar la calidad y continuidad en la prestación de los servicios, la ampliación permanente de la cobertura y la atención prioritaria en materia de agua potable y saneamiento básico.

La línea 4 de Inclusión Social del plan de Desarrollo 2012- 2015: "Antioquia la más Educada", apunta a: "facilitar el acceso a las oportunidades para alcanzar un desarrollo humano integral a partir del reconocimiento de las garantías y derechos a los habitantes de Antioquia sin discriminación por territorio, familia, raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o condición".

En este orden de ideas la Gerencia de Servicios Públicos ha desarrollado diferentes programas y proyectos que apuntan al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el plan de Desarrollo, en donde el programa bandera es: **Antioquia Potable, Electrificada y Limpia**

a. Programa: Antioquia Potable. Electrificada y Limpia

El objetivo del programa es aumentar el acceso a los sistemas de agua potable, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos en forma responsable y equitativa a la población antioqueña asegurando la sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social.

[4] Colombia. Constitución Política. 1991

[5] Colombia. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142. (11, julio, 1994). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 1994. Diario Oficial No. 41.433

Para el cumplimiento del programa dentro del plan se desarrollaron tres proyectos que son:

- Ampliación de los servicios de Agua potable y saneamiento.
- Apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos
- Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Ampliación de los servicios de Agua potable y saneamiento:

Su objetivo es ampliar el servicio con la construcción de nuevas redes de acueducto y alcantarillado que permitan aumentar la cobertura de los servicios; garantizando a la población el acceso al agua para el consumo humano y el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas; solucionando la carencia de agua potable y saneamiento en aquellas zonas de difícil acceso con sistemas no convencionales; y fortaleciendo las Empresas de Servicios Públicos (E.P.S.) en el manejo administrativo, financiero y técnico con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la ESP y con ello la continuidad en la prestación de los servicios.

Construcción de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

En el proyecto se desarrollan las actividades principales de la Gerencia, esto se ve reflejado en los recursos que fueron asignados para el periodo 2012 -2015 el cual tiene un peso del 84% sobre el total del presupuesto, en este proyecto se ejecutan los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones - SGP Ley 1176 de 2007, que destina una participación con destinación específica para el sector agua potable y saneamiento básico.

La Ley de servicios públicos, Ley 142 de 1994, introdujo reformas institucionales en la prestación, regulación, control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, orientadas a la descentralización, la participación privada y el logro de una mayor eficiencia y competencia. Dentro de este marco, los gobiernos departamentales son responsables de la coordinación de la política sectorial regional y de apoyar a los municipios es en la financiación de sus planes de inversión.

El Gobierno nacional a través del El Decreto 3200 de 2008 por medio del cual reglamentó la Política Sectorial de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA –, como una herramienta que permitiera armonizar los lineamientos del Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación definidos en los documentos CONPES 3463 de 2007 y CONPES 3383 de 2005 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”; decreto que fue derogado en el 2012 por el Decreto 2246 por medio el cual se ajustan los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento a partir del análisis de sus avances

y desarrollo; teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y de las personas prestadoras de los servicios públicos, así como la implementación efectiva de esquemas de regionalización.

Se tienen **64 municipios** Vinculados al Programa Aguas para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP - PDA.

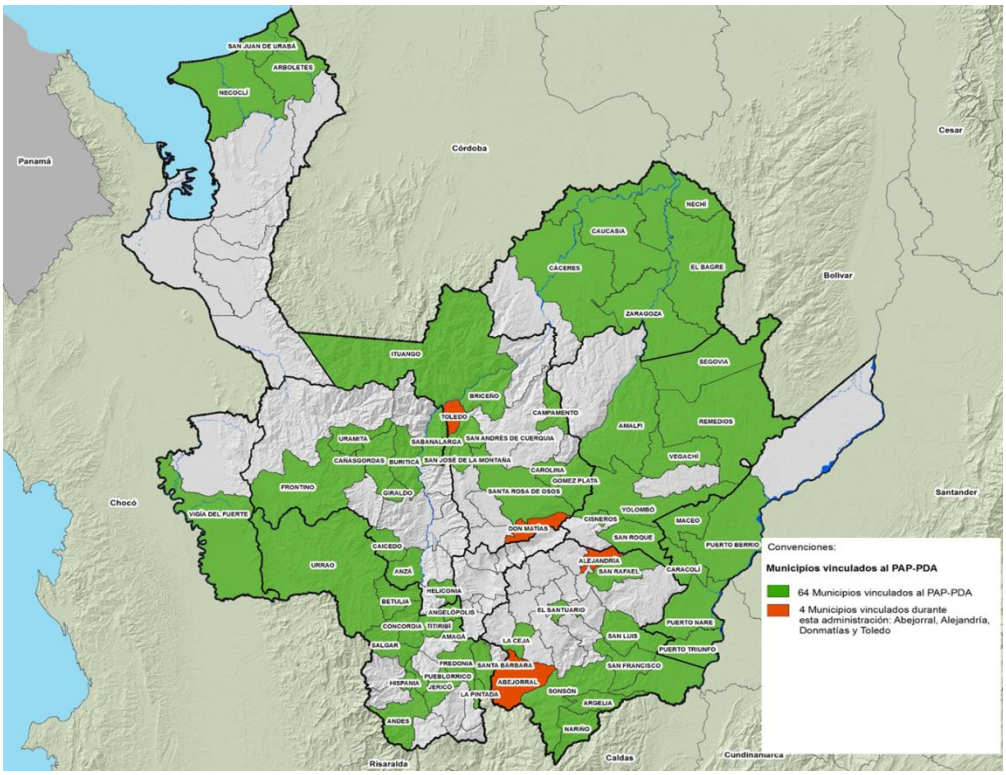

Los recursos disponibles a 15 de diciembre de 2015 manejados directamente en el FIA[6] ver Tabla No. 28 y 29.

[6] Informe FIA – NOVIEMBRE de 2015 - FIA

Tabla No. 28 DISPONIBILIDAD DEPARTAMENTO Y NACIÓN AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	174.609.165.474,12	19.438.995.848,07	150.279.834.008,70	43.768.327.313,49
Recursos Nación	23.281.572.865,00	2.105.816.260,98	34.364.892.095,46	(8.977.502.969,48)
Regalías	-	-	-	-
Otros Recursos	-	-	-	-
Recursos CAR	-	-	-	-
Banco Mundial	-	-	-	-
SGP Contrato Plan	-	-	-	-
Rec. Nación. Contrato Plan	3.954.870.528,00	163.783.409,99	3.954.870.528,00	163.783.409,99
Crédito BID	-	-	5.917.672.689,00	(5.917.672.689,00)
Regalías- SGR Fondo Desarrollo Regional	-	-	-	-
Regalías- SGR Fondo Compensación Regional	-	-	-	-
Recursos Nación- Estratégico	-	-	-	-
TOTAL	**201.845.608.867,12**	**21.708.595.519,04**	**194.517.269.321,16**	**29.036.935.065,00**

Tabla No. 29 DISPONIBILIDAD MUNICPIOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD
SGP	65.814.149.742,79	4.916.193.809,79	38.198.122.922,19	**32.532.220.630,39**
Recursos Nación	-	-	-	**-**
Regalías	-	-	-	**-**
Otros Recursos	-	-	-	**-**
Recursos CAR	-	-	-	**-**
Banco Mundial	-	-	-	**-**
SGP Contrato Plan	-	-	-	**-**
Rec. Nación. Contrato Plan	-	-	-	**-**
Crédito BID	-	-	-	**-**
Regalías- SGR Fondo Desarrollo Regional	-	-	-	**-**
Regalías- SGR Fondo Compensación Regional	-	-	-	**-**
Recursos Nación- Estratégico	-	-	-	**-**
TOTAL	**65.814.149.742,79**	**4.916.193.809,79**	**38.198.122.922,19**	**32.532.220.630,39**

Adicionalmente la Gerencia de Servicios Públicos cuenta con destinación presupuestal proveniente de recursos propios y recursos de libre destinación con los cuales se ejecutan proyectos para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales.

En la vigencia **2012** bajo este proyecto se suscribió con recurso del Gobierno Nacional un convenio para la optimización del sistema de aguas residuales del **municipio de Turbo.**

En la Vigencia **2013** bajo este proyecto se suscribieron un total de **42** convenios o contrato en los cuales se desarrollaron obras de infraestructura que mejoraron las condiciones de calidad, cobertura y continuidad de las comunidades beneficiadas y de obra pública.

En la vigencia **2014** bajo este proyecto se suscribieron un total de **29** convenios o contrato en los cuales se desarrollaron obras de infraestructura que mejoraron las condiciones de calidad, cobertura y continuidad de las comunidades beneficiadas y de obra pública.

En el año **2015** se ha realizado un total de **45** convenios o contratos en los cuales se desarrollaron obras de infraestructura que mejoraron las condiciones de calidad, cobertura y continuidad de las comunidades beneficiadas y de obra pública.

Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Bajo este proyecto se desarrollan los proyectos de mejoramiento y optimización de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado asegurando de esta manera la prestación eficiente de los servicios Públicos.

En la vigencia del **2012** se continuó con la ejecución de las obras de mejoramiento las cuales iniciaron en vigencias pasadas culminándose **24 obras de acueducto** y **10 de alcantarillado** en diferentes municipios del Departamento.

En la vigencia del **2013** se adelantaron contrataciones con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos para el año, al final del año se optimizaron **9 sistemas de acueducto y 4 sistemas de alcantarillado.**

En la vigencia del año **2014** se adelantaron contrataciones con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos para el año, al final del año se optimizaron **4 sistemas de acueducto y 2 sistemas de alcantarillado.**

A 30 de septiembre de **2015** se adelantaron contrataciones con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos para el año, al final del año se optimizaron **1 sistemas de acueducto.**

Construcción y/o Instalación de sistemas alternativos para la prestación del servicio de agua potable y el saneamiento asociado en zonas de difícil acceso.

Conscientes de las necesidades de la población rural antioqueña ubicada en zonas de difícil acceso en donde no se pueden construir sistemas convencionales de acueducto y alcantarillado la Gerencia de Servicios Públicos se considero viable suministrar soluciones alternativas para la potabilización de agua en pequeña y mediana escala. Con este programa se pretende mejorar la calidad del agua en las zonas rurales y disminuir el índice de Riesgo (IRCA).

Es así como en el año **2012** se inició con un proyecto piloto con la compra de **350 filtros** individuales beneficiando las poblaciones afro descendientes de la zona de Urabá (San Pedro, Vigía y Murindo, y comunidades del Bajo Cauca (El Bagre, Zaragoza y Nechi)

En el año **2013** se continuó con la estrategia y fueron entregados **812 filtros.**

En el año **2014** se continuó con la estrategia y fueron entregados **1900 filtros.**

Adicional a las soluciones individuales para potabilización de agua se beneficiaron **55.122** estudiantes de **436** instituciones educativas de **114** municipios con la instalación de sistemas de potabilización. (2012:42, 2013:75, 2014:156, 2015:163)

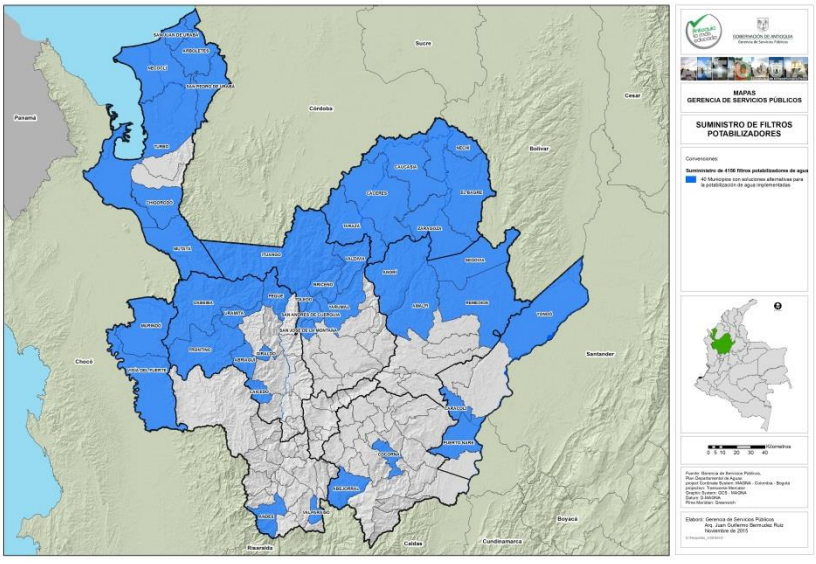

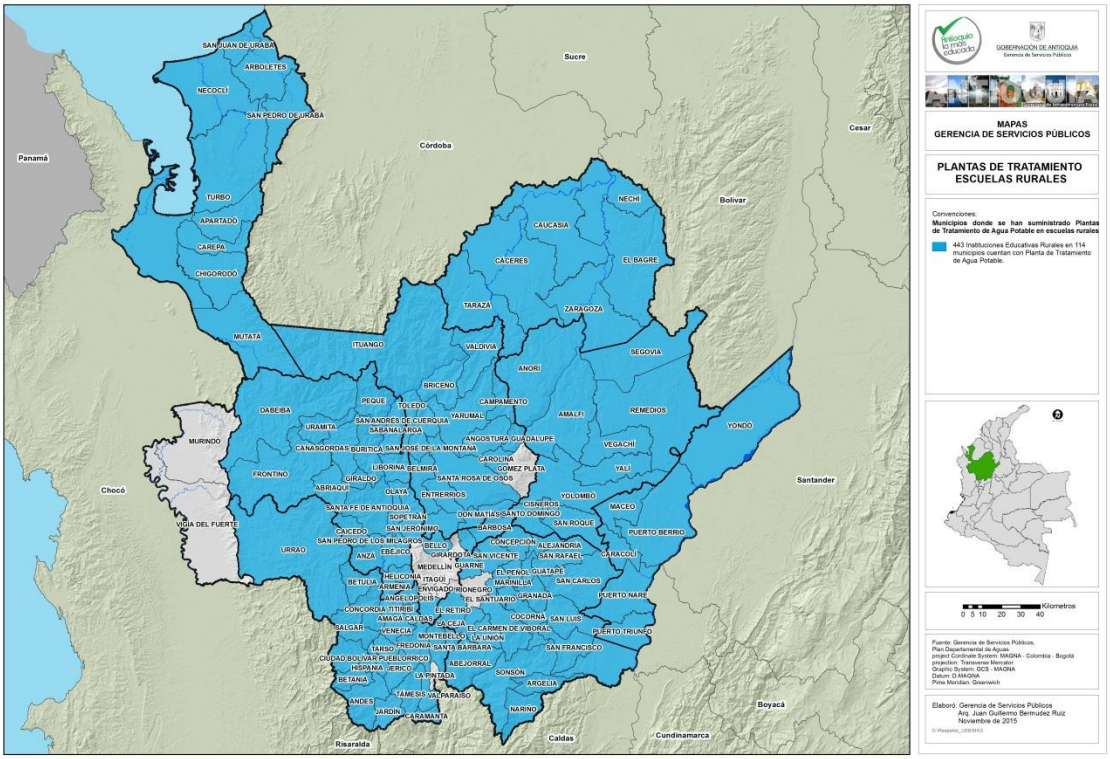

Implementación de modelos empresariales que operen los servicios de acueducto, saneamiento y aseo en el departamento y las regiones limítrofes.

Para cumplir con las responsabilidades de la Ley, en el componente de fortalecimiento institucional, la Gobernación de Antioquia, a través de Gerencia de Servicios Públicos suscribió convenio con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), con el objeto de "Aunar esfuerzos para el desarrollo institucional, fortalecimiento, transformación o creación de empresas con el fin de asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y garantizar la eficiencia de las inversiones y la ejecución óptima de las obras para la modernización y transformación del sector agua potable y saneamiento básico".

El Plan de Aseguramiento para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios de Antioquia, contempla como objetivo fundamental desarrollar las acciones necesarias para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación de los servicios en el Departamento mediante el desarrollo metodológico establecido en el Decreto 2246 de 2012.

Figura 1. Fases del Plan de Aseguramiento

Figura 2. Línea de tiempo plan de aseguramiento

A 30 de diciembre de 2015 se han atendido **84** municipios, las actividades que se han realizado bajo los componentes administrativo, comercial, financiero, institucional y legal, y operativo ascienden a 1.904 (Figura 3.)

Figura 3. Total de actividades de fortalecimiento ejecutadas.

El 45% de las asistencias técnicas estuvo enfocado al tema Operativo, en segundo lugar con un 25% el tema Institucional y Legal y en un tercer lugar, el 15% corresponde al tema administrativo para los municipios con los cuales se definió como estrategia el fortalecimiento.

En 57 municipios se definió como estrategia de aseguramiento en la prestación de los servicios públicos la de **fortalecimiento institucional**, en estos municipios se han realizado asesorías y asistencias técnicas en las áreas institucional y legal, administrativa, comercial, financiera y técnico operativo.

En 13 municipios la estrategia es la transformación empresarial; iniciando con la asesoría para el agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, asistencia técnica frente al debido proceso, se realizaron reuniones con cada uno de los alcaldes municipales, posteriormente se han efectuado reuniones con los Concejos municipales en donde se ha socializado el modelo de acuerdo para otorgar facultades al alcalde para el debido agotamiento. De igual manera se ha informado a las administraciones municipales las implicaciones que tienen por la descertificación del municipio, especialmente por el no agotamiento del artículo 6.

Una (1) empresa de servicios públicos se encuentra en causal de **liquidación**, para lo cual ha contado con la asesoría jurídica necesaria y se ha realizado fortalecimiento al área operativa de la empresa.

Para el fortalecimiento de competencias del personal que labora en las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo se realizaron Diplomados virtuales con el apoyo de la Universidad de Medellín:

- Se realizaron 4 cohortes del Diplomado virtual en gestión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo" (120 horas)
- Se realizaron 4 cohortes del "Diplomado virtual en operación y mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado" (120 horas)
- Se realizaron dos cohortes del "Curso virtual en aseo" (60 horas).

Con el propósito de fortalecer las asociaciones y comunidades organizadas, a los cuales se le ejecutó obras en las zonas rurales se realizó asesoría técnica a 39 prestadores ubicados en área rural de 31 municipios (16 vinculados al PAP-PDA), de estos; 24 prestadores recibieron un esquema completo de asesoría técnica en donde se realizó transferencia de conocimiento y acompañamiento para la realización de actividades comerciales, administrativas, Técnico – operativa y financieras encaminadas a la adecuada operación, administración y sostenimiento de la infraestructura instalada.

Los restantes 15 prestadores recibieron asesoría especifica por requerimiento, especialmente asesoría jurídica, comercial (estructura tarifaria) y técnica frente a la adecuada operación de los sistemas de tratamiento.

Se diseñó, desarrolló y montó un sitio web sobre el componente de fortalecimiento empresarial que a 31 de diciembre de 2015 tiene información sobre 78 municipios. El sitio se alimenta constantemente y ha exigido la elaboración de textos, gráficos y el renombramiento de más de 1300 informes de actividades. El sitio web se puede consultar en el link :http://www.antioquiapotableylimpiapda.com/

Apoyar a los Municipios en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos

El propósito del proyecto es trabajar de la mano con los municipios para la definición del PGIRS, que permita establecer la ruta a cada municipio en el manejo de residuos sólidos; buscando que los municipios hagan un uso adecuado en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que permitan una Antioquia limpia y protectora de su medio ambiente.

Se ejecutaron durante el cuatrienio actividades conjuntas con las autoridades ambientales - CORNARE - CORANTIOQUIA - CORPOURABA - AREA METROPOLITANA.

En particular con CORANTIOQUIA se desarrolló un trabajo conjunto cuyos resultados permitieron focalizar el acompañamiento con relación al manejo de los residuos sólidos.

Adicionalmente se adquirieron conjuntamente con **17 municipios**, nuevos vehículos recolectores generando con ello beneficio a **211.200 personas** con la recolección oportuna y adecuada de los residuos sólidos

77.700 personas de **13 municipios** se beneficiaron con la nueva infraestructura para la adecuada disposición de los residuos sólidos.

Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales.

El propósito del proyecto es trabajar de la mano con los municipios para la definición del PGIRS, que permita establecer la ruta en el manejo de residuos sólidos; buscando que los municipios hagan un uso adecuado en el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que permitan una Antioquia limpia y protectora de su medio ambiente.

Se encontró en el año 2012 que la mayoría de los municipios del Departamento de Antioquia no habían realizado la evaluación y actualización de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos PGIRS, desde el año 2005 donde fueron elaborados y adoptados por cada municipio. De acuerdo con lo anterior y con el propósito que los municipios cumplieran con el Decreto 1505 de 2003, en donde se obliga a los municipios a ejecutar un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS bajo la metodología adoptada por la Resolución 1045 de 2003; en el año **2013** se suscribió con CORANTIOQUIA un convenio para la actualización de **80 PGIRS** en los municipios de la jurisdicción de la Corporación.

Con la actualización de los PGIRS se garantiza el mejoramiento continuo en la prestación del servicio de aseo, además de ser n instrumento de planificación que permitirá mejorar, en forma progresiva y con la participación de la ciudadanía, todos los elementos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos en los diferentes municipios buscando, con su actualización y ejecución, no sólo mejorar las condiciones en las cuales se efectúa el manejo de los residuos sólidos generados sino también la integración de dicho manejo con los procesos de desarrollo sostenible adelantados en la Subregión, Departamento y País.

Fortalecimiento a los municipios en el manejo integral de los residuos sólidos

En el año **2012** con el propósito de apoyar y fortalecer a los municipios en la prestación integral de los residuos sólidos se logro apoyar a **dos (2)** municipios **(Betulia y San Carlos)** en la construcción del relleno sanitario y adquisición del vehículo compactador.

En el año **2013**, con el propósito de apoyar y fortalecer a los municipios en la prestación integral de los residuos sólidos se logro apoyar a **cuatro (4)** mediante la firma de convenios para la adquisición de vehículos recolectores esta vez en los municipios de

Chigorodó, Cisneros y Puerto Nare y se apoyo al municipio de Urrao en la construcción del relleno sanitario.

En el año **2014**, con el propósito de apoyar y fortalecer a los municipios en la prestación integral de los residuos sólidos se logro apoyar a **NUEVE (9** mediante la firma de convenios para la adquisición de vehículos recolectores esta vez en los municipios de Ciudad Bolívar, Jérico, Fredonia, La Unión y Marinilla y se apoyaron a los municipios de Belmira y Yondo en la construcción del relleno sanitario, adicionalmente se contrataron los diseños del relleno sanitario del municipio de Peque y se apoyo la operación del servicio de aseo en el Municipio de Murindo.

En el año **2015**, con el propósito de apoyar y fortalecer a los municipios en la prestación integral de los residuos sólidos se logró apoyar a **catorce (14)** mediante la firma de convenios para la adquisición de vehículos recolectores esta vez en los municipios de La Pintada, Santafe de Antioquia, Santo Domingo, Carolina del Príncipe, Vegachi, San Luis, Nariño y Tamesis y se apoyaron a los municipios de Peque, Cocorna, Betania, Alejandría, Abejorral y Anza en la construcción del relleno sanitario, se realizaron los diseños de los rellenos sanitarios de los municipios de Donmatias y Cocorna.

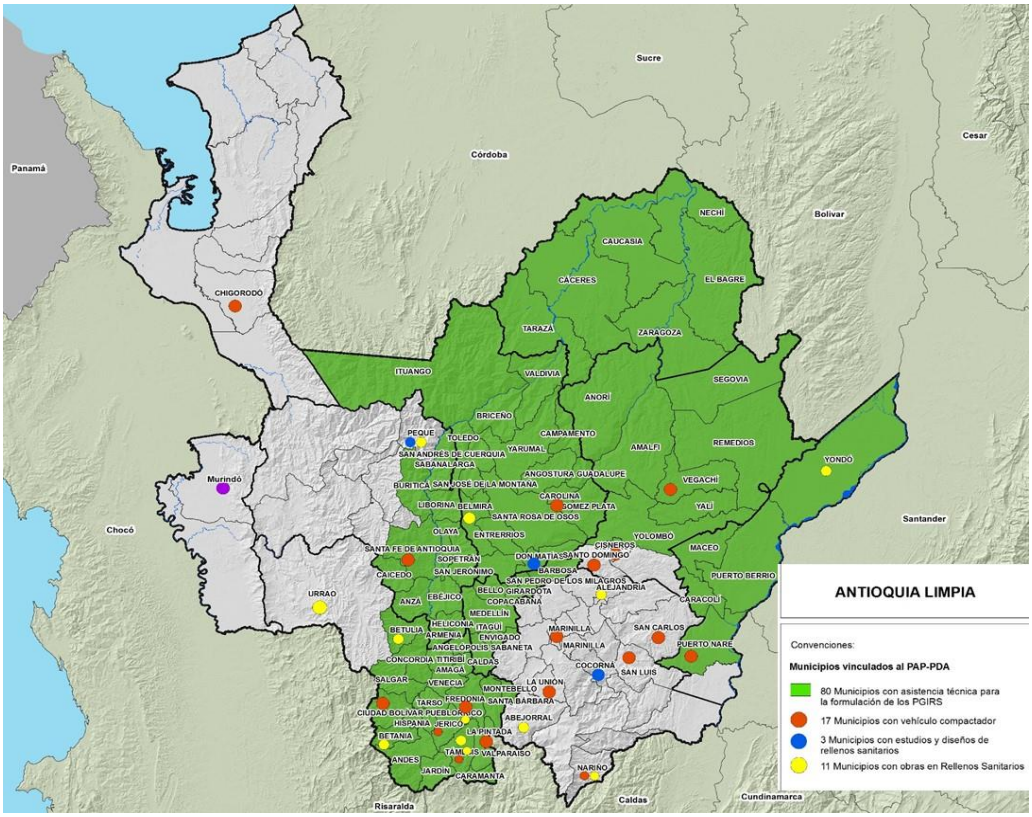

Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

El objetivo del proyecto es solucionar la falta de energía en aquellas zonas de difícil acceso con sistemas no convencionales; llevar energía eléctrica a la población rural del Departamento de Antioquia a través de la cofinanciación en la construcción de instalaciones domiciliarias de energía; y participar en la expansión de los servicios de gas natural y GLP que permita maximizar el uso de los recursos.

Apoyo y aumento de las coberturas en Electrificación Rural.

El artículo 97 de Ley 142 de 1994, establece que los Departamentos podrán financiar los subsidios otorgados a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor; por esta razón la Gobernación de Antioquia se ha unido al programa “Antioquia Iluminada”, con el cual se ha llegado al 98% de cobertura en electrificación. En asocio con las Empresas Públicas de Medellín quienes con su experiencia construyen las redes de uso general, la Gobernación de Antioquia subsidia las conexiones de energía las cuales son de responsabilidad del usuario; de esta manera se contribuye a que mas antioqueños y antioqueñas accedan a este servicio.

Es así como en los años 2012 - 2013 - 2014 y 2015 se invirtieron recursos de la Gobernación al programa Antioquia Iluminada realizando **23.747** conexiones domiciliarias en **108** municipios del Departamento, beneficiando a **430.000** personas.

Construcción de sistemas alternativos de energía

En el Departamento de Antioquia en el año 2006 existían cerca de 100.000 viviendas que carecían del servicio de energía eléctrica, ubicadas en zonas aisladas sin acceso al servicio. A la fecha de hoy restan 23.000 instalaciones que debe ser atendidas mediante el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER, estas viviendas por encontrarse en zonas apartadas del Departamento no es posible en algunos casos por motivos técnicos o financieros extender la redes de energía razón por la cual es necesario acceder al servicio con fuentes alternativas de energía, como son solar, geotérmica, biomasa (madera y residuos agrícolas).

La Gobernación de Antioquia con el propósito de apoyar a los municipios en esta labor ha adelantó en el año 2013 la contratación para el suministro e instalación de cuarenta (40) estufas solares en zonas rurales del municipio de Guadalupe y suscribió un convenio con para la repotenciación de la microcentral hidroeléctrica del Municipio de San José de la Montaña".

En el año 2014 continúa apoyando a los municipios y en asocio con EPM adelantó un proyecto piloto que se ocupará de atender centros educativos, con el propósito de analizar la solución energética más óptima con el fin de proveer del servicio a dichas comunidades; la energía llego a 15 comunidades indígenas, beneficiando a 2.019 personas.

Adicionalmente adelantó la el suministro, transporte e instalación de plantas de energía para las zonas rurales en el municipio de Vigía del Fuerte - Departamento de Antioquia, y la construcción de obras civiles para la optimización de la microcentral, vereda concha abajo, Municipio de Anorí.

Apoyo y aumento de las Coberturas de Gas

Durante el período 2012 a junio de 2014 la Gobernación de Antioquia apoya el programa liderado por las Empresas Públicas de Medellín denominado “Gas sin Fronteras”, el cual ha ejecutado alrededor de 27.281 Conexiones domiciliarias en 13 municipios del Departamento con un valor aproximado de 20.519 millones.

Se benefician **920.000 personas** de **90** municipios y **18** corregimientos con la conexión al servicio de gas natural.

Los aliados principales para estas inversiones han sido EPM y Alcanos.

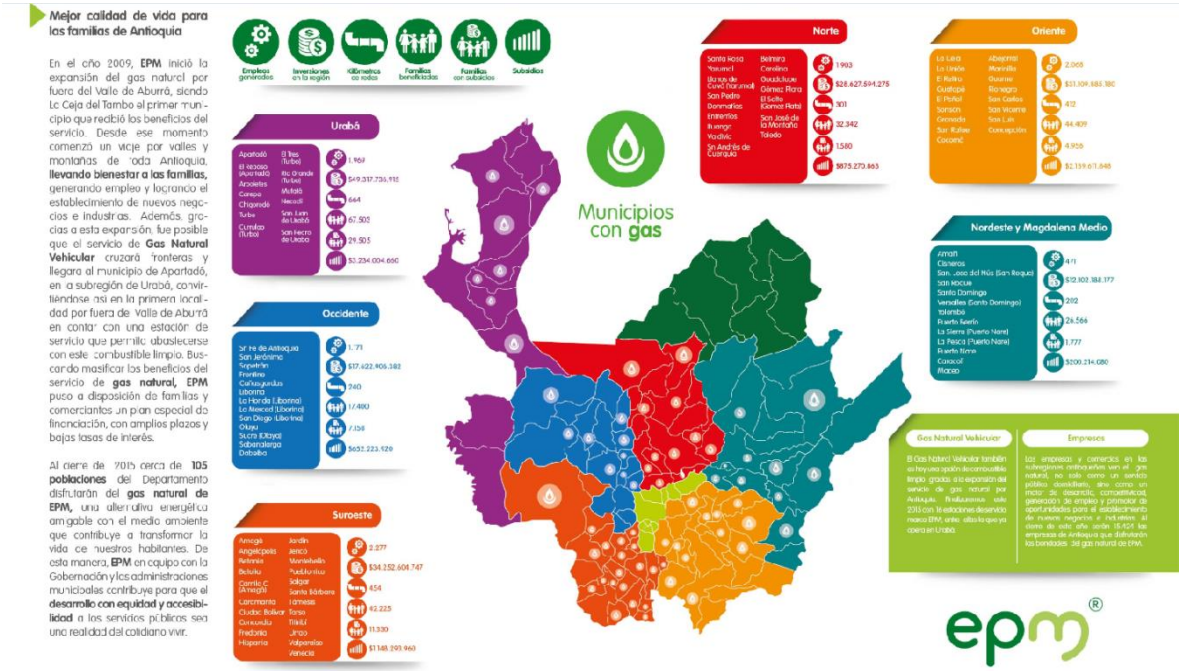

7. OBRAS PÚBLICAS:

VIGENCIA FISCAL 2012

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
1	2012-CF-37-0122	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TURBO	$1.331.000.000	$ 1.996.176.524	AGUAS DE URABA S.A E.S.P	**LIQUIDADO**
2	2012-CF-37-0141	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDAS NO. 1 Y 2 PARA LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.	$ 331.535.616	$ 271.631.713	MUNICIPIO DE BETULIA	**LIQUIDADO** Aporte de la Gobernación $ 271.631.713
3	2012-CF-37-0143	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE EXPANSIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “GAS SIN FRONTERAS” EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 10.800.950.000	$ 11.237.896.000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	**LIQUIDADO** Aporte de la Gobernación $ 1.759.498.000
		TOTAL - 3 -	**$12.463.485.616**	**$13.505.707.237**		

VIGENCIA FISCAL 2013

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
1	4600000306	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN GUILLERMO GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN – ANTIOQUIA	$ 643.783.372	$ 643.783.372	MUNICIPIO DE SONSÓN	LIQUIDADO
2	4600000391	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL-INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA – EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ANTIOQUIA ILUMINADA” EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 2.395.856.255,00	$ 2.395.856.255,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	LIQUIDADO
3	4600000508	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA GAS SIN FRONTERAS	$ 2.992.636.077,00	$ 3.992.636.077,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	LIQUIDADO
4	4600000737	CONSTRUCCION DE REDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO BATALLON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	$ 199.949.634,00	$ 199.949.634,00	MONTAJES DE MARCA S.A	LIQUIDADO
5	4600000749	OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE LAS VEREDAS LOS PEÑOLES, LA CEJA Y LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	$ 218.178.897,00	$ 218.178.897,00	DHS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	POR LIQUIDAR
6	4600000864	OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ	$ 489.331.851,00	$ 489.331.851,00	GUINCO S.A.S	LIQUIDADO
7	4600000915	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN MIGUEL EL RESPALDO MUNICIPIO DE ALEJANDRIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 549.570.500,00	$ 549.570.500,00	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	LIQUIDADO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
8	4600000932	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	$ 216.000.000,00	$ 216.000.000,00	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	LIQUIDADO
9	4600000933	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ	$ 1.208.389.366,00	$ 1.208.389.366,00	CONSORCIO ACUEDUCTOS ANTIOQUIA 2013 (CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT 75% Y SOTARCO S.A.S 25%)	LIQUIDADO
10	4600000993	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE SABALETAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA	$ 483.582.743,00	$ 483.582.743,00	CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT	LIQUIDADO
11	4600001107	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	$ 207.305.090,00	$ 270.891.913,00	UNIÓN TEMPORAL RESIDUOS URRAO (CORPORACION HORIZONTE AZUL 50% - ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S.S.A. E.S.P. 50%)	LIQUIDADO
12	4600001108	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS RURALES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 497.006.325,00	$ 497.006.325,00	UNION TEMPORAL INSOCAPITOL (INGENIERIA Y SOFTWARE AMBIENTAL E.U 50% - GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL S.L. 50%)	POR LIQUIDAR
13	2013-CF-37-0266	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO – II FASE DE LA REGIÓN DE URABÁ, MUNICIPIOS DE TURBO, CAREPA, APARTADÓ Y CHIGORODÓ	$ 3.402.429.567,00	$ 3.402.429.567,00	EMPRESA REGIONAL AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.	POR LIQUIDAR
14	2013-CF-37-0328	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y AGUAS DE URABA S.A. E.S.P. PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL BOHÍO ETAPA II, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ” EN EL MARCO DEL ACUERDO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO DEL ATRATO GRAN DARIÉN.	$ 3.768.113.783,00	$ 3.768.113.783,00	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	EN EJECUCIÓN

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
15	2013-CF-37-0329	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y AGUAS DE URABA S.A. E.S.P. PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTIN" EN EL MARCO DEL ACUERDO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO DEL ATRATO GRAN DARIÉN	$ 695.892.555,00	$ 695.892.555,00	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	EN EJECUCIÓN
16	2013-OO-37-0001	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES VILLANUEVA Y SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS	$ 955.936.982,00	$ 955.936.982,00	CONSORCIO REDES 2013 (ICG PROYECTOS S.A.S 50% - OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 50%)	LIQUIDADO
17	2013-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PRIMERA ETAPA	$ 1.672.270.797,00	$ 1.672.270.797,00	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	LIQUIDADO
18	2013-OO-37-0005	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, SEGUNDA ETAPA.	$ 1.741.574.691,00	$ 2.111.574.691,00	CONSORCIO PLAN MAESTRO 13 (ICG PROYECTOS S.A.S. 50%-CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA 50%)	LIQUIDADO
19	2013-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL SECTOR EL OASIS MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	$ 1.353.486.402,00	$ 1.353.486.402,00	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	LIQUIDADO
20	2013-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ – PRIMERA ETAPA.	$ 1.234.453.185,00	$ 1.494.658.419,00	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	POR LIQUIDAR
21	2013-OO-37-0008	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PRIMERA ETAPA	$ 1.704.777.775,00	$ 2.089.777.775,00	CONSORCIO TUPAC SERVICIOS PUBLICOS PUERTO TRIUNFO (GUINCO SAS 75%-CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERÍA SAS 25%)	LIQUIDADO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
22	2013-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – PRIMERA ETAPA	$ 1.370.063.567,00	$ 1.785.047.137,00	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	LIQUIDADO
23	2013-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO - ANTIOQUIA - ETAPA 1	$ 885.002.707,00	$ 1.225.329.103,00	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL S.A.S.	LIQUIDADO
24	2013-OO-37-0011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMAGA Y ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA	$ 1.886.702.398,00	$ 2.328.798.823,00	INGENIERIA & CONTRATOS S.A.S	POR LIQUIDAR
25	2013-OO-37-0012	CONSTRUCCION DE OBRAS PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ (ANTIOQUIA)	$ 1.669.692.782,00	$ 2.029.786.717,00	CONSORCIO MECONSTRUEQUIPOS-JAR (MECONSTRUEQUIPOS S.A.S. 50% - JESÚS ÁNGEL RESTREPO PÉREZ 50%)	POR LIQUIDAR
26	2013-OO-37-0013	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETULIA – ANTIOQUIA	$ 2.020.456.490,00	$ 2.020.456.490,00	CONSORCIO MI ANTIOQUIA (INGENIERÍA Y VIAS SAS 50% Y MORRISSON INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA 50%)	LIQUIDADO
27	2013-OO-37-0014	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MESTRO DE ACUEDUCTO Y PRIMERA ETAPA DEL PLAN MESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA.	$ 1.829.931.765,00	$ 1.821.599.846,00	M.S CONSTRUCCIONES S.A	LIQUIDADO
28	2013-OO-37-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP- PDA.	$ 1.666.574.216,00	$ 1.666.574.216,00	CONSORCIO NARIÑO (COLCIVIL S.A.75%-DISEÑO ABSOLUTO 25%)	LIQUIDADO
29	2013-OO-37-0016	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	$ 1.450.523.156,00	$ 1.893.283.592,00	UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS-5 (PEDRO HERNANDO ESCUCHA B 75 - JUAN CARLOS ROJAS ACERO)	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
30	2013-OO-37-0017	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, PRIMERA ETAPA	$ 2.207.468.661,00	$ 2.207.468.661,00	CONSORCIO ALARCON ANTIOQUIA (CONSTRUSOCIAL S.A.S. 50% - HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%)	LIQUIDADO
31	2013-OO-37-0018	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ - MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	$ 272.373.474,00	$ 272.373.474,00	SOTARCO LTDA	LIQUIDADO
32	2013-OO-37-0019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	$ 209.106.382,00	$ 219.053.948,00	DHS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	LIQUIDADO
33	2013-OO-37-0029	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ETAPA I	$ 7.342.743.435,00	$ 10.892.497.424,00	CONSORCIO URBANO CM (MIC3 S.A.S 50% Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 50%)	POR LIQUIDAR
34	2013-OO-37-0030	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LOS SECTORES INDEPENDIENTES LA ARBOLEDA, HOSPITAL Y MATADERO	$ 635.989.813,00	$ 635.989.813,00	CHAMAT INGENIEROS LTDA	LIQUIDADO
35	2013-OO-37-0031	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	$ 1.545.979.951,00	$ 1.545.979.951,00	R&U CONSTRUCTORES SAS	LIQUIDADO
36	2013-OO-37-0032	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	$ 2.390.062.936,00	$ 2.390.062.936,00	CONSORCIO URBANO CSC (COMPAÑÍA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CASCO 50% - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 25% - SEGIO TORRES REATIGA 25%)	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
37	2013-OO-37-0033	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, PRIMERA ETAPA	$ 1.491.649.113,00	$ 2.272.649.113,00	CONSORCIO URBANO CSC (COMPAÑÍA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CASCO 50% - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 25% - SEGIO TORRES REATIGA 25%)	POR LIQUIDAR
38	2013-OO-37-0034	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONO URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, ETAPA II	$ 3.541.597.436,00	$ 3.541.597.436,00	INGOMON S.A.S	POR LIQUIDAR
39	2013-OO-37-0035	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO – ETAPA 2	$ 2.104.252.512,00	$ 2.104.252.512,00	R&U CONTRSUCCIONES S.A.S	LIQUIDADO
40	2013-OO-37-0036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO PRIMERA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	$ 2.567.761.083,00	$ 2.567.761.083,00	CONSORCIO CONSTRUCTORA CADIZ (AZ CONSTRUCCIONES S.A.S 50% - CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A. 25% - ALVARO DELIO ZAPATA RENDON 25%)	LIQUIDADO
41	2013-OO-37-0037	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO- PRIMERA ETAPA	$ 594.323.336	$ 594.323.336	AGIL S.A	LIQUIDADO
42	2013-OO-37-0038	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO SEGUNDA ETAPA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JERICÓ EN EL MARCO DE LA LLL ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.236.264.829	$ 1.286.264.829	REDYCO S.A.S	LIQUIDADO
		TOTAL - 42 -	**$65.549.045.889**	**$74.010.468.344**		

VIGENCIA FISCAL 2014

No	NO. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
1	4600001778	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTIOQUIA ILUMINADA" PARA LA COFINANCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 2.866.602.887,00	$ 2.866.602.887,00	EPM	POR LIQUIDAR
2	4600001801	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO "LA TEMPERATURA", DEL ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA, DECLARADA MEDIANTE RESOLUCION 116672 DEL 11 DE JULIO DE 2014	$ 91.145.990,00	$ 336.754.828,00	REDYCO SAS Nit: 890.937.165-8 Representante legal: Julian Sanin Trujillo C.C 3.309.829	LIQUIDADO
3	4600001841	CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA TUBERÍA INSTALADA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LA TUBERÍA EXISTENTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA	$ 381.216.008,00	$ 381.216.008,00	UNIÓN TEMPORAL INSOCAPITOL Nit 900.671.268-1, (integrada por Grupo Empresarial Capitol S.L. (SUCURSAL EXTRANJERA) 50% y INGENIERÍA Y SOFTWARE AMBIENTAL E.U. 50%), representante legal CARMELO ESPINOSA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de extranjería No. 459602 - Dirección: Diagonal 57 No. 43-109 del municipio de Bello, teléfono 596 30 38 - 320 784 29 52. Email: proyectosgrupocapitol@gmail.com - juanfelipemorales@gmail.com.	POR LIQUIDAR
4	4600001899	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "GAS SIN FRONTERAS""	$ 9.482.888.800,00	$ 9.482.888.800,00	EPM	POR LIQUIDAR

No	CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
5	4600001937	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I. GRUPO II	$ 3.171.351.843,00	$ 3.171.351.843,00	UNIÓN TEMPORAL INSOCAPITOL, con Nit No. 900.671.268-1, representante legal CARMELO ESPINOSA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de extranjería No. 459602. Dirección - Diagonal 57 No. 43-109 del municipio de Bello, teléfono 596 30 38 - 320 784 29 52. Email: proyectosgrupocapitol@gmail.com - juanfelipemorales@gmail.com	LIQUIDADO
6	4600001940	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I. GRUPO I	$ 1.011.317.970,00	$ 1.011.317.970,00	CONSORCIO MM, con Nit No. 900.674.228-9, representante legal CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.131.889. Dirección - carrera 11 No. 44-192 B/ Maraya de la ciudad de Pereira, teléfono 345 17 41 - 300 774 30 08, Email: camazapa1@yahoo.com	POR LIQUIDAR
7	4600001941	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I". GRUPO III	$ 409.588.437,00	$ 409.588.437,00	MECONSTRUEQUIPOS S.A.S, con Nit No. 900.211.521-6, representante legal NELSON EDGAR VERGARA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.184.352. Dirección - carrera 66 B Circular 4 - 17 oficina 201, teléfono 230 27 72, Email: meconstruequipos@gmail.com.	LIQUIDADO
8	4600001944	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROCENTRAL, VEREDA CONCHA ABAJO, MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA	$ 246.457.105,00	$ 246.457.105,00	CONHIME S.A.S. Nit: 811.027.144-1, Representado Legalmente por el señor RAÚL ARIAS GALLEGO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.130.854-Dirección: calle 54 No. 56 - 15 de la ciudad de Medellín, teléfono 293 20 19 - 321 830 79 30, Email: conhimeltda@yahoo.es - jesus.meza@conhime.com.	POR LIQUIDAR
9	4600002056	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 688.347.830,00	$ 688.347.830,00	UNION TEMPORAL INSOCAPITOL NIT 900.671.267-1 (Grupo Empresarial Capitol S.L, (Sucursal Extranjera) 50%, INSOAM E.U 50%), Representado por Carmelo Espinosa Gutierrez con CC 459602	LIQUIDADO

No	CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
10	4600002065	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL RESGUARDO INDÍGENA JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 193.008.017,00	$ 193.008.017,00	SANEAR S.A. con NIT N° 890.928.186-4 Representada por luis Anibal Espinal Ramirez con CC 71.875.863	LIQUIDADO
11	4600002066	GRUPO III: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CORREGIMIENTO MANDÉ DEL MUNICIPIO DE URRAO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 458.290.132,00	$ 458.290.132,00	DISEÑO ABSOLUTO S.A con NIT N° 811.014.782-4, Reprensentada por Andres Felipe Aguirre Gallego con CC 98.621.016	POR LIQUIDAR
12	4600002184	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 858.284.257,00	$ 858.284.257,00	EPM	LIQUIDADO
13	4600002200	APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIAR EL COSTO DE LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS PARA LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 317.375.000,00	$ 317.375.000,00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A	POR LIQUIDAR
14	4600002215	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO MANUAL - MECÁNICO "LAS AMÉRICAS" MUNICIPIO DE YONDÓ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 550.000.000,00	$ 550.000.000,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO ESP	LIQUIDADO
15	4600002233	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE BELMIRA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 486.413.177,00	$ 486.413.177,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELMIRA EMPUBEL E.S.P	LIQUIDADO

No	NO. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
16	4600002326	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA VEREDA SAN BASILIO MEDIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	MUNICIPIO DE GUADALUPE	POR LIQUIDAR
17	4600002447	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 191.097.038,00	$ 191.097.038,00	JORGE MARIO PATIÑO ZULUAGA CC. 98.593.444 OPCION INGENIERIA S.A,S NIT 900.372.514-4	POR LIQUIDAR
18	4600002449	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE SHOIBADO DE LA VEREDA SAN PEDRO MEDIO EN EL MUNCIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	$ 248.805.618,00	$ 248.805.618,00	CONSTRUCTORA BETANCUR S.A.S NIT. 900.181.453-3 JAFET BETANCUR GIRON CC. 71.250.971	POR LIQUIDAR
19	4600002458	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 281.390.148,00	$ 281.390.148,00	CONSORCIO GJ INGENIERIA NIT 900.773.582-6 FERNANDO LEON GIRALDO JARAMILLO CC. 71.110.184	POR LIQUIDAR
20	4600002657	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA EL AUMENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 249.317.402,00	$ 249.317.402,00	APROTEC S.A.S NIT 900.409.806-1	POR LIQUIDAR
21	4600002895	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA.	$ 9.792.899.738,00	$ 9.792.899.738,00	CONSORCIO VIGÍA NIT 900.795.332-6	EN EJECUCIÓN
22	2014-OO-37-0001	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES – ANTIOQUIA	$ 2.049.739.699,00	$ 2.049.739.699,00	UNION TEMPORAL RAMICON 2014 NIT 900707991-4 integrada por CONHYDRA S.A E.S.P 50%, RAMIREZ & CIA. S.A 50%, representada legalmente por AMED EUGENIO MONTOYA NARANJO, c.c. 70.553.760 DIRECCION Calle 32 F#63A-117 - Medellín	LIQUIDADO

No	NO. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
23	2014-OO-37-0002	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA - ETAPA I	$ 986.089.077,00	$ 986.089.077,00	CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A, NIT 800214137-1 representada legalmente por ALVARO JOBANNY GOMEZ JARAMILLO, con c.c. 8.349.200 - Calle 38 Sur #43A-24 Of.201 Envigado	LIQUIDADO
24	2014-OO-37-0003	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE MACEO. ETAPA II	$ 1.222.077.978,00	$ 1.222.077.978,00	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 811011847-0 representada legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN, con c.c. 71.591.704	POR LIQUIDAR
25	2014-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP – PDA	$ 1.204.937.564,00	$ 1.204.937.564,00	PAECIAS S.A.S Nit 890.929.487-0, representante legal ANDRÉS FELIPE ESPINOSA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.792.037. Dirección: Carrera 25 No. 1 A Sur - 155 oficina 247 de la ciudad de Medellín, teléfono 604 140 72, Email: agpines@hotmail.com	LIQUIDADO
26	2014-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,	$ 3.492.740.818,00	$ 3.492.740.818,00	CONSORCIO PALACIOS ZAPATA 2014 (CARLOS MARIO PALACIO CHAMAT 75%- EDGAR ALONSO ZAPATA ARANGO 25%)	CONTRATO SUSPENDIDO
27	2014-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, TERCERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO I	$ 1.860.197.321,00	$ 1.860.197.321,00	CONSORCIO CM ANTIOQUIA (CASCO S.A.S 75% - MIC3 S.A.S 25%) REPRESENTADO POR EL SEÑOR ANDRES FELIPE RESTREPO ANGEL CC. 8.025.797)	POR LIQUIDAR
28	2014-OO-37-0011	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PRIMERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO II	$ 686.922.735,00	$ 686.922.735,00	CONSTUCCIONES Y TRACTORES S.A-CONYTRAC CON NIT 890.932.730-7 REPRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS CON CC. 70.556.498	LIQUIDADO
29	2014-OO-37-0012	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PRIMERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO III	$ 1.850.049.464,00	$ 1.850.049.464,00	CONSORCIO MM (CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ 50% - JOSE MARIO GIRALDO ENCISO 50%) REPRESNETADO LEGALMENTE POR CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ COJ CC. 10.131.889	LIQUIDADO

No	NO. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
30	2014-OO-37-0014	GRUPO I: OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ETAPA 2	$ 643.504.482,00	$ 643.504.482,00	MECONSTRUEQUIPOS S.A. NIT 900.211.521-6	POR LIQUIDAR
31	2014-OO-37-0015	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS SEGUNDA ETAPA	$ 3.372.142.486,00	$ 4.001.029.490,00	CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT NIT 15435479	EN EJECUCIÓN
32	2014-OO-37-0016	GRUPO III: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL – ETAPA 1.	$ 2.017.439.843,00	$ 2.017.439.843,00	INGEOMEGA S.A. NIT 800.027.813-0	POR LIQUIDAR
33	2014-OO-37-0017	GRUPO IV: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ETAPA 2.	$ 1.462.244.252,00	$ 1.462.244.252,00	UNION TEMPORAL ESICON PDA 19 2014	LIQUIDADO
34	2014-OO-37-0018	GRUPO V: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE URAMITA	$ 1.645.546.928,00	$ 1.645.546.928,00	CONSORCIO JG-VC	POR LIQUIDAR
		TOTAL - 34 -	**54.745.513.224**	**55.620.009.066**		

VIGENCIA FISCAL 2015

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
1	4600003953	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL MUNICIPIO DE EBEJICO, OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (GRUPO I)	$ 1.170.173.000,00	$ 1.250.115.584,00	CONSORCIO REDES ANTIOQUIA IMC NIT 900.852.475-5	POR LIQUIDAR
2	4600003899	Grupo II: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LOPEZ EN CIUDAD BOLIVAR (GRUPO II)	$ 1.703.126.049,00	$ 1.703.126.049,00	AGUIDEL SAS NIT 811.001.387-1	POR LIQUIDAR
3	4600004502	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 1.920.467.006,00	$ 1.920.467.006,00	CONSORCIO CASTRILLON ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS NIT 900.868.642-9 REP LEGAL MANUEL CAMILO SOTO CC 1130617753	POR LIQUIDAR
4	4600004603	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELENCITO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA	$ 478.032.389,00	$ 478.032.389,00	INSOAM E.U 900.255.039-6 REP. LEGAL JUAN FELIPE MORALES TABARES CC 71221197	POR LIQUIDAR
5	2015OO370012	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. RESOLUCION No. 201500280363	$ 245.108.320,00	$ 245.108.320,00	GRUCON SAS NIT 800203342-8	POR LIQUIDAR
6	2015SS370006	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 391.764.909,00	$ 391.764.909,00	UNION TEMPORAL HC INGENIEROS ANTIOQUIA - HERNAN CUERVO	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
7	2015OO370001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRIA, ANDES, ANGOSTURA, ANZA, ARBOLETES, CARAMANTA Y TAMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 2.738.714.303,00	$ 2.737.224.136,00	INGEOMEGA S.A NIT. 800.027.813-0	POR LIQUIDAR
8	2015OO370002	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ-ETAPA II.	$ 8.950.788.998,00	$ 8.947.077.750,00	CONOSRCIO SAN JUAN 2015 (CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT 50% - EDGAR ALONSO ZAPATA 25% - DISEÑO ABSOLUTO SA 25%	EN EJECUCIÓN
9	2015OO370003	GRUPO I CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ETAPA II	$ 3.949.289.365,00	$ 3.938.084.345,00	CONSORCIO C & A integrado por (ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P – A.A.S S.A E.S.P 50% - COLOMBIANA DE INGENIERÍA Y AGUAS S.A. CIAS S.A 50%)	EN EJECUCIÓN
10	2015OO370004	GRUPO II CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - SEGUNDA ETAPA	$ 680.787.822,00	$ 680.787.822,00	MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ CC. 16.746.985	POR LIQUIDAR
11	2015OO370005	GRUPO II CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	$ 2.570.022.442,00	$ 2.558.302.113,00	CONSORCIO MARTINA PLAN MAESTRO SEGOVIA (GEDESA S.A 50% - ICG LTDA 50%) NIT 900.850.895-6	EN EJECUCIÓN
12	2015OO370006	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA – ANTIOQUIA	$ 1.197.712.012,00	$ 1.191.007.029,00	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2015 integrado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT y CONSTRUCCIONES PALOR SAS	EN EJECUCIÓN
13	2015OO370007	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	$ 1.030.209.384,00	$ 1.030.209.384,00	MAURO VELEZ GOMEZ CC. 71,338,676	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
14	2015OO370008	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA ETAPA 2.	$ 3.345.445.745,00	$ 3.325.571.810,00	CONSORCIO PLAN MAESTRO 06 integrado por PROVIAS SAS y CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA	EN EJECUCIÓN
15	2015OO370009	EJECUCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ ZONA URBANA	$ 1.819.094.006,00	$ 1.811.331.772,00	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2015 integrado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT y CONSTRUCCIONES PALOR SAS	EN EJECUCIÓN
16	2015OO370017	GRUPO I: MUNICIPIO DE NECOCLÍ: OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ETAPA I	$ 2.132.031.402,00	$ 2.132.031.402,00	OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S NIT. 811.046.667-2	EN EJECUCIÓN
17	2015OO370018	GRUPO II: MUNICIPIO DE PUERTO NARE: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	$ 1.547.731.509,00	$ 1.547.731.509,00	OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS CC 91.291.293	EN EJECUCIÓN
18	2015OO370013	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ETAPA I.	$ 1.599.112.067,00	$ 1.599.112.067,00	AZ CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT No.811.011.847-0, representado legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía N° 71.591.704 de Medellín; GRUPO I	EN EJECUCIÓN
19	2015OO370014	Grupo II: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE COLECTORES Y REDES SECUNDARIAS DEL BARRIO SAN ANTONIO Y LOS ALMENDROS - ZONA URBANA MUNICIPIO DE DON MATIAS	$ 1.891.085.679,00	$ 1.891.085.679,00	AZ CONSTRUCCIONES SAS. identificado con NIT No.811.011.847-0, representado legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía N° 71.591.704 de Medellín	EN EJECUCIÓN

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
20	2015OO370015	Grupo III: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I.	$ 3.229.374.615,00	$ 3.229.374.615,00	CONSORCIO DISEÑO PALOR integrado por CONSTRUCCIONES PALOR SAS 50% y DISEÑO ABSOLUTO SA 50%, representado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT identificado con cedula de ciudadanía 71.774.893 de Medellín al GRUPO III	EN EJECUCIÓN
21	2015OO370016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 851.215.154,00	$ 851.215.154,00	CONSORCIO MURILLO ARANA (ANDRES RICARDO MURILLO 50% - BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA 50%)	EN EJECUCIÓN
22	2015OO370019	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMALFI – ETAPA II	$ 2.585.023.811,00	$ 2.585.023.811,00	CONSORCIO PD PLAN MAESTRO AMALFI (CONSTRUCCIONES PALOR S.A.S 50% - DISEÑO ABSOLUTO S.A 50%)	EN EJECUCIÓN
23	2015OO370020	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ETAPA 1	$ 586.698.642,00	$ 586.698.642,00	OMEGA INGENIERIA ASOSCIADOS S.A.S NIT 811.046.667-2	EN EJECUCIÓN
24	2015OO370021	GRUPO I CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ.	$ 1.963.133.980,00	$ 1.913.134.955,00	CONSORCIO SAN FERNANDO REY (JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 75% - EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL COLOMBIA 25%)	LEGALIZADO
25	2015OO370022	GRUPO II: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA ETAPA II.	$ 3.201.517.254,00	$ 3.124.539.674,00	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	LEGALIZADO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
26	EN PROCESO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN, MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA.	$ 3.651.860.331,00	$ 3.651.860.331,00	PENDIENTE	EN PROCESO
27	2015AS370098	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA TAFETANES - MUNICIPIO DE SAN JERONIMO – ANTIOQUIA	$ 1.162.111.893,00	$ 1.162.111.893,00	REGIONAL DE OCCIDENTE S.A NIT 900130596-1	EN EJECUCIÓN
28	2015AS370005	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LA RED DE ADUCCIÓN EN EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MANANTIALES EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA	$ 203.000.000,00	$ 203.000.000,00	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS OSCAR ALBERTO DE JESUS PEREZ BETANCUR CC. 15.253.606	POR LIQUIDAR
29	2015AS370089	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA	$ 853.230.824,00	$ 853.230.824,00	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO S.A E.S.P NIT. 811.043.219-2 REP. LEGAL DORA ELENA RAMIREZ FRANCO CC. 43796666	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
30	2015AS370095	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, SECTOR SUR DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 1.323.794.908,00	$ 1.323.794.908,00	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - CORANTIOQUIA NIT 890.981.105-2 811.000.231-7	EN EJECUCIÓN
31	2015AS370007	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA.	$ 336.008.892,00	$ 336.008.892,00	MUNICIPIO DE HISPANIA EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P	POR LIQUIDAR
32	2015AS370090	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS, MUNICIPIO DE SEGOVIA	$ 1.883.983.069,00	$ 1.883.983.069,00	MUNICIPIO DE SEGOVIA	POR LIQUIDAR
33	2015AS370102	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL SECTOR COLEGIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLI	$ 196.742.753,00	$ 196.742.753,00	MUNICIPIO DE CARACOLI	POR LIQUIDAR
34	2015AS370002	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL TRATAMIENTO EN SITIO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 1.252.800.000,00	$ 1.252.800.000,00	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA NIT 811.032.187-8	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
35	2015AS370008	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.	$ 521.299.505,00	$ 521.299.505,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE NIT 800.013.060-0	POR LIQUIDAR
36	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LAS DELICIAS, LAS MARÍAS Y VILLA LUZ, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA.	$ 4.486.551.203,00	$ 4.486.551.203,00	PENDIENTE	EN PROCESO
37	EN PROCESO	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - SEGUNDA ETAPA.	$ 1.407.669.051,00	$ 1.407.669.051,00	PENDIENTE	EN PROCESO
38	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA –ETAPA 2 E IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.	$ 5.782.642.263,00	$ 5.782.642.263,00	PENDIENTE	EN PROCESO
39	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO.	$ 2.517.514.855,00	$ 2.517.514.855,00	PENDIENTE	EN PROCESO
40	EN PROCESO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.	$ 2.933.343.900,00	$ 2.933.343.900,00	PENDIENTE	EN PROCESO
41	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ZONA URBANA MUNICIPIO DE TITIRIBI-ANTIOQUIA.	$ 8.669.144.937,00	$ 8.669.144.937,00	PENDIENTE	EN PROCESO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
42	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.	$ 2.220.900.093,00	$ 2.220.900.093,00	PENDIENTE	EN PROCESO
43	EN PROCESO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO MANGLAR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	$ 733.476.429,00	$ 733.476.429,00	PENDIENTE	EN PROCESO
44	EN PROCESO	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA.	$ 480.617.131,00	$ 480.617.131,00	PENDIENTE	EN PROCESO
45	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	$ 1.883.771.810,00	$ 1.883.771.810,00	PENDIENTE	EN PROCESO
46	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAIMA, EL CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.	$ 2.407.087.804,00	$ 2.407.087.804,00	PENDIENTE	EN PROCESO
47	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA 1	$ 3.361.249.603,00	$ 3.361.249.603,00	PENDIENTE	EN PROCESO
48	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	$ 991.287.092,00	$ 991.287.092,00	PENDIENTE	EN PROCESO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
49	EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS EL DEPARTAMENTO, LA PLANTA Y MONACO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ – ANTIOQUIA.	$ 4.671.405.643,00	$ 4.671.405.643,00	PENDIENTE	EN PROCESO
50	4600003070	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR, MUNICIPIO DE LA PINTADA	$ 330.000.000,00	$ 330.000.000,00	MUNICIPIO DE LA PINTADA	LIQUIDADO
51	4600003423	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (RELLENO SANITARIO) EN LOS MUNICIPIOS DE COCORNA Y DON MATIAS - ANTIOQUIA	$ 300.362.406,00	$ 300.362.406,00	CORPORACION HORIZONTE AZUL NIT 811.033.451-2	POR LIQUIDAR
52	4600003163	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR. MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	$ 408.000.000,00	$ 408.000.000,00	EMPRESA OCCIDENTE LIMPIO S.A E.S.P NIT 900.057.276-6	LIQUIDADO
53	4600003424	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	$ 270.000.000,00	$ 270.000.000,00	EPM NIT 890,904,996-1	LIQUIDADO

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
54	4600004359	MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE ABANDONO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 905.899.480,00	$ 905.899.480,00	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA CC 12130133	POR LIQUIDAR
55	4600003934	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO MANUAL - MECÁNICO EN EL MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA	$ 847.995.814,00	$ 847.995.814,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE EDWIN JAIR USUGA ORTIZ CC. 1.035.580.851	POR LIQUIDAR
56	4600003911	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAMESIS E.S.P. S.A.S PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS Y AL TERRENO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMESIS.	$ 51.416.592,00	$ 51.416.592,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TAMESIS E.S.P. S.A.S NIT. 900.378.953-1	POR LIQUIDAR
57	4600004092	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	$ 281.361.732,00	$ 281.361.732,00	MUNICIPIO DE JERICO	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
58	4600003109	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIAR EL COSTO DE LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS PARA LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN DE VIBORAL Y PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP NIT 891.101.577-4	POR LIQUIDAR
59	4600003283	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "GAS SIN FRONTERAS""	$ 4.586.033.400,00	$ 4.586.033.400,00	EPM NIT 890.904.996-1	POR LIQUIDAR
60	4600003541	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTIOQUIA ILUMINADA" PARA LA COFINANCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 1.300.000.000,00	$ 1.300.000.000,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT. 890.904.996-1 REP LEGAL: JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO CC. 70566038	POR LIQUIDAR
61	4600003912	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 1.143.229.767,00	$ 1.143.229.767,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT 890.904.996-1	POR LIQUIDAR

No	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUYE ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO
62	4600004134	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. PARA EL AUMENTO EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 2.335.139.825,00	$ 2.335.139.825,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT 890.904.996-1	POR LIQUIDAR
63	2015AS370109	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS - FIP Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS.	$ 7.154.754.666,00	$ 7.154.754.666,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDE DE INVERSION PARA LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	EN EJECUCIÓN
		TOTAL - 63 -	**126.223.347.534**	**126.113.845.597**		

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

De acuerdo a la información de la **Secretaria de Hacienda**, dependencia que realizó el cierre oficial del presupuesto en cada una de las vigencias, la ejecución presupuestal de la Gerencia de Servicios Públicos es la siguiente:

GERENCIA SERVICIOS PÚBLICOS

TIPO DE RECURSO	2012		2013	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCION
Libre Destinación	1.171.644.494	46,98%	5.181.860.974	95,60%
Destinacion Específica	30.377.583.270	84,23%	41.268.942.245	86,94%
Crédito	0	0,00%	3.632.119.176	99,62%
Balance Libre Destinación	0	0,00%	0	0,00%
Balance Destinación Específica	14.946.697.864	83,78%	18.086.903.958	92,60%
Cancelación Reservas	43.955.358	0,00%	42.154.057	0,00%
TOTAL	**46.539.880.986**	**83,07%**	**68.211.980.410**	**89,72%**

GERENCIA SERVICIOS PÚBLICOS

TIPO DE RECURSO	2014		2015*diciembre	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% EJECUCION
Libre Destinación	5.560.386.059	91,87%	3.411.730.796	98%
Destinacion Específica	40.339.377.377	81,96%	44.900.065.603	74%
Crédito	6.740.000.000	98,97%	1.776.441.413	98.9%
Balance Libre Destinación	0	0,00%	0	0,00%
Balance Destinación Específica	8.517.855.224	73,64%	13.717.218.797	85%
Cancelación Reservas	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	**61.157.618.660**	**83,58%**	**63.805.456.609**	**76 %**

9. CONTRATACION:

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FECHA	FECHA	FECHA	ESTADO CONTRATO
2012-SS-37-0145	SUMINISTRO DE FILTROS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DE LOS MUNICIPIOS DE EL BAGRE, NECHÍ, ZARAGOZA, MURINDÓ, SAN PEDRO DE URABÁ Y VIGÍA DEL FUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	IWANA GREEN GROUP SAS	$ 56.589.400,00	10/12/2012	17/12/2012	17/12/2012	LIQUIDADO
4600000306	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN GUILLERMO GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN – ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE SONSÓN	$ 643.783.372,00	08/08/2013	08/01/2014	08/01/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600000519	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, FORTALECIMIENTO, TRANSFORMACIÓN O CREACIÓN DE EMPRESA CON EL FIN DE ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 11.342.895.960,00	08/10/2013	13/12/2015	13/06/2016	EN EJECUCIÓN
4600000550	ANUAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE SOLUCIONES DE POTABILIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 802.523.869,00	16/10/2013	31/12/2013	16/10/2015	LIQUIDADO
4600000564	SUMINISTRO DE FILTROS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	SAWYER DE COLOMBIA S.A.S	$ 231.985.094,00	10/09/2013	10/12/2013	10/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600000577	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CHINA-CUARTAS DE LOS MUNICIPIOS DE BELLO Y SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	$ 800.000.000,00	01/10/2013	31/12/2013	04/12/2014	LIQUIDADO
4600000737	CONSTRUCCION DE REDES DE PLANTA DE TRATAMIENTO BATALLON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	MONTAJES DE MARCA S.A	$ 199.949.634,00	12/11/2013	12/01/2014	12/01/2014	LIQUIDADO
4600000749	OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE LAS VEREDAS LOS PEÑOLES, LA CEJA Y LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LIBORINA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	DHS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 218.178.897,00	25/10/2013	24/12/2013	25/12/2013	POR LIQUIDAR
4600000864	OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	GUINCO S.A.S	$ 489.331.851,00	25/10/2013	25/01/2014	25/02/2014	LIQUIDADO
4600000915	AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN MIGUEL EL RESPALDO MUNICIPIO	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	$ 549.570.500,00	19/11/2013	07/12/2013	20/04/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DE ALEJANDRIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA								
4600000933	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO ACUEDUCTOS ANTIOQUIA 2013 (CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT 75% Y SOTARCO S.A.S 25%)	$ 1.208.389.366,00	12/11/2013	12/01/2014	12/01/2014	LIQUIDADO
4600000942	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA YONDO (DISECONSTRUIR LTDA 15% - GUILLERMO AMAYA RUIZ 85%)	$ 97.543.008,00	12/11/2013	26/01/2014	26/01/2014	LIQUIDADO
4600000993	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE SABALETAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT	$ 483.582.743,00	25/11/2013	12/01/2014	25/02/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001108	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS RURALES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	UNION TEMPORAL INSOCAPITOL (INGENIERIA Y SOFTWARE AMBIENTAL E.U 50% - GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL S.L. 50%)	$ 497.006.325,00	12/11/2013	12/01/2014	12/01/2014	LIQUIDADO
4600001130	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL TRATAMIENTO EN SITIO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA	$ 1.200.000.000,00	28/11/2013	28/05/2014	28/05/2014	LIQUIDADO
4600001193	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION VILLA ESPERANZA MUNICIPIO DE CARACOLÍ	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MECONSTRUEQUIPOS-JAR (MECONSTRUEQUIPOS S.A.S. 50% - JESÚS ÁNGEL RESTREPO PÉREZ 50%)	$ 217.592.077,00	02/12/2013	17/01/2014	17/01/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001206	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CHINA-CUARTAS DE LOS MUNICIPIOS DE BELLO Y SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	$ 45.530.224,00	24/11/2014	24/12/2014	24/12/2014	LIQUIDADO
4600001233	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SECTOR CUCHILLAS DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ACUAMETRO S.A	$ 113.502.034,00	09/12/2013	29/12/2013	29/12/2013	LIQUIDADO
2013-CF-37-0266	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO – II FASE DE LA REGIÓN DE URABÁ, MUNICIPIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN	EMPRESA REGIONAL AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.	$ 3.402.429.567,00	12/11/2013	31/10/2014	31/10/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DE TURBO, CAREPA, APARTADÓ Y CHIGORODÓ								
2013-OO-37-0001	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES VILLANUEVA Y SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO REDES 2013 (ICG PROYECTOS S.A.S 50% - OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 50%)	$ 955.936.982,00	11/03/2013	11/07/2013	26/08/2013	LIQUIDADO
2013-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	$ 1.672.270.797,00	27/05/2013	09/12/2013	10/03/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0005	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, SEGUNDA ETAPA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PLAN MAESTRO 13 (ICG PROYECTOS S.A.S. 50%-CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA 50%)	$ 2.111.574.691,00	08/04/2013	08/10/2013	08/02/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	$ 1.353.486.402,00	10/04/2013	10/08/2013	10/10/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	RESIDUAL SECTOR EL OASIS MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO								
2013-OO-37-0007	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ – PRIMERA ETAPA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	JAVIER ANTONIO HERRERA OSORIO	$ 1.494.658.419,00	24/04/2013	24/09/2013	03/04/2014	POR LIQUIDAR
2013-OO-37-0008	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO TUPAC SERVICIOS PUBLICOS PUERTO TRIUNFO (GUINCO SAS 75%-CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERÍA SAS 25%)	$ 2.089.777.775,00	10/04/2013	10/10/2013	27/01/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	$ 1.785.047.137,00	24/04/2013	30/09/2013	01/12/2013	LIQUIDADO
2013-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL S.A.S.	$ 1.225.329.103,00	08/04/2013	23/08/2013	08/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CAICEDO - ANTIOQUIA - ETAPA 1								
2013-OO-37-0011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMAGA Y ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	INGENIERIA & CONTRATOS S.A.S	$ 2.328.798.823,00	17/07/2013	17/03/2014	24/11/2014	POR LIQUIDAR
2013-OO-37-0012	CONSTRUCCION DE OBRAS PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANZÁ (ANTIOQUIA)	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MECONSTRUEQUIPOS-JAR (MECONSTRUEQUIPOS S.A.S. 50% - JESÚS ÁNGEL RESTREPO PÉREZ 50%)	$ 2.029.786.717,00	01/08/2013	01/03/2014	13/09/2014	POR LIQUIDAR
2013-OO-37-0013	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETULIA –ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MI ANTIOQUIA (INGENIERÍA Y VIAS SAS 50% Y MORRISSON INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA 50%)	$ 2.020.456.490,00	29/07/2013	29/03/2014	29/03/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0014	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MESTRO DE ACUEDUCTO Y PRIMERA ETAPA DELPLAN MESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE BRICEÑOANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	M.S CONSTRUCCIONES S.A	$ 1.821.599.846,00	26/08/2013	26/04/2014	16/05/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0015	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP- PDA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO NARIÑO (COLCIVIL S.A.75%- DISEÑO ABSOLUTO 25%)	$ 1.666.574.216,00	20/08/2013	20/02/2014	20/06/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0016	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	UNIÓN TEMPORAL P&P INGENIEROS-5 (PEDRO HERNANDO ESCUCHA B 75 - JUAN CARLOS ROJAS ACERO)	$ 1.893.283.592,00	22/07/2013	22/01/2014	27/07/2014	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0017	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO ALARCON ANTIOQUIA (CONSTRUSOCIAL S.A.S. 50% - HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ 50%)	$ 2.207.468.661,00	29/07/2013	13/01/2014	28/03/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0018	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ - MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	SOTARCO LTDA	$ 272.373.474,00	30/08/2013	30/10/2013	30/10/2013	LIQUIDADO
2013-OO-37-0019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	DHS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	$ 219.053.948,00	27/08/2013	27/10/2013	24/11/2013	LIQUIDADO
2013-OO-37-0029	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - ETAPA I	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO URBANO CM (MIC3 S.A.S 50% Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 50%)	$ 10.892.497.424,00	29/11/2013	29/09/2014	28/05/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0031	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	R&U CONSTRUCTORES SAS	$ 1.545.979.951,00	######	######	######	LIQUIDADO
2013-OO-37-0032	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO URBANO CSC (COMPAÑÍA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CASCO 50% - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 25% - SEGIO TORRES REATIGA 25%)	$ 2.390.062.936,00	17/12/2013	17/08/2014	30/11/2014	POR LIQUIDAR
2013-OO-37-0033	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO URBANO CSC (COMPAÑÍA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - CASCO 50% - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S 25% - SEGIO TORRES REATIGA 25%)	$ 2.272.649.113,00	15/01/2014	15/05/2014	15/12/2014	POR LIQUIDAR
2013-OO-37-0034	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONO URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, ETAPA II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	INGOMON S.A.S	$ 3.541.597.436,00	06/03/2014	06/12/2014	23/06/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0035	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO – ETAPA 2	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	R&U CONTRSUCCIONES S.A.S	$ 2.104.252.512,00	07/02/2014	06/10/2014	06/12/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO PRIMERA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP - PDA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO CONSTRUCTORA CADIZ (AZ CONSTRUCCIONES S.A.S 50% - CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A. 25% - ALVARO DELIO ZAPATA RENDON 25%)	$ 2.567.761.083,00	17/02/2014	17/09/2014	17/11/2014	LIQUIDADO
2013-OO-37-0037	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO HACIA LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO- PRIMERA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	AGIL S.A	$ 594.323.336,00	28/04/2014	28/07/2014	18/10/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0038	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO SEGUNDA ETAPA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JERICÓ EN EL MARCO DE LA LLL ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	REDYCO S.A.S	$ 1.286.264.829,00	27/01/2014	27/05/2014	28/07/2014	LIQUIDADO
2013-SS-37-0009	CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S. S.A. E.S.P.	$ 3.751.710.675,00	08/04/2013	08/10/2013	08/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-SS-37-0024	CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SEGUNDA ETAPA.	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S. S.A. E.S.P.	$ 1.119.364.429,00	02/09/2013	02/12/2013	02/12/2013	LIQUIDADO
2013-SS-37-0026	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S. S.A. E.S.P.	$ 4.503.912.686,00	17/09/2013	14/04/2014	17/11/2014	LIQUIDADO
4600001801	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO "LA TEMPERATURA", DEL ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE ZARAGOZA - ANTIOQUIA, DECLARADA	CONTRATACIÓN DIRECTA-URGENCIA MANIFIESTA	OBRA PÚBLICA	REDYCO SASNit: 890.937.165-8Representante legal: Julian Sanin TrujilloC.C 3.309.829	$ 336.754.828,00	15/07/2014	15/09/2014	15/10/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	MEDIANTE RESOLUCION 116672 DEL 11 DE JULIO DE 2014								
4600001841	CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA TUBERÍA INSTALADA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LA TUBERÍA EXISTENTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	UNIÓN TEMPORAL INSOCAPITOL Nit 900.671.268-1, (integrada por Grupo Empresarial Capitol S.L. (SUCURSAL EXTRANJERA) 50% y INGENIERÍA Y SOFTWARE AMBIENTAL E.U. 50%), representante legal CARMELO ESPINOSA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de extranjería No. 459602 - Dirección: Diagonal 57 No. 43-109 del municipio de Bello, teléfono 596 30 38 - 320 784 29 52. Email: proyectosgrupocapitol@gmail.com - juanfelipemorales@gmail.com.	$ 381.216.008,00	15/08/2014	30/10/2014	30/10/2014	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001937	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I. GRUPO II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	UNIÓN TEMPORAL INSOCAPITOL, con Nit No. 900.671.268-1, representante legal CARMELO ESPINOSA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de extranjería No. 459602. Dirección - Diagonal 57 No. 43-109 del municipio de Bello, teléfono 596 30 38 - 320 784 29 52. Email: proyectosgrupocapitol@gmail.com - juanfelipemorales@gmail.com	$ 3.171.351.843,00	21/08/2014	05/02/2015	05/02/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001940	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I. GRUPO I	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MM, con Nit No. 900.674.228-9, representante legal CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.131.889. Dirección - carrera 11 No. 44-192 B/ Maraya de la ciudad de Pereira, teléfono 345 17 41 - 300 774 30 08, Email: camazapa1@yahoo.com	$ 1.011.317.970,00	27/08/2014	27/12/2014	27/12/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001941	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I". GRUPO III	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	MECONSTRUEQUIPOS S.A.S, con Nit No. 900.211.521-6, representante legal NELSON EDGAR VERGARA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.184.352. Dirección - carrera 66 B Circular 4 - 17 oficina 201, teléfono 230 27 72, Email: meconstruequipos@gmail.com.	$ 409.588.437,00	25/08/2014	25/11/2014	25/11/2014	LIQUIDADO
4600001984	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	CONHYDRA S.A.E.S.P. NIT 811.011.165-6 GIOVANNI ESTEBAN ZAPATA ISAZA CC 71.719.447	$ 41.623.688,00	10/09/2014	10/12/2014	10/12/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001986	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS SUBREGIONES OCCIDENTE, ORIENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CONSORCIO IBECO Nit No. 900.754.879-7, representante legal DORA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.830.686; DIRECCIÓN: Carrera 43 A No. 1 sur 188 oficina 401 de Medellín, teléfono 312 05 43 - 317 573 13 14-Email: ingenieria_basica@hotmail.com	$ 480.283.499,00	20/08/2014	20/02/2015	20/02/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002056	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	UNION TEMPORAL INSOCAPITOL NIT 900.671.267-1 (Grupo Empresarial Capitol S.L, (Sucursal Extranjera) 50%, INSOAM E.U 50%), Representado por Carmelo Espinosa Gutierrez con CC 459602	$ 688.347.830,00	15/09/2014	15/01/2015	15/01/2015	LIQUIDADO
4600002065	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL RESGUARDO INDÍGENA JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	SANEAR S.A. con NIT N° 890.928.186-4 Representada por luis Anibal Espinal Ramirez con CC 71.875.863	$ 193.008.017,00	17/09/2014	17/12/2014	17/12/2014	LIQUIDADO
4600002066	GRUPO III: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CORREGIMIENTO MANDÉ DEL MUNICIPIO DE URRAO, DEPARTAMENTO DE	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	DISEÑO ABSOLUTO S.A con NIT N° 811.014.782-4, Reprensentada por Andres Felipe Aguirre Gallego con CC 98.621.016	$ 458.290.132,00	15/09/2014	15/01/2015	15/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	ANTIOQUIA.								
4600002092	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE SHOIBADO DE LA VEREDA SAN PEDRO MEDIO EN EL MUNCIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	CONSORCIO MARSELLA .NIT 900.726.766-4. Conformado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez 40%-Construcciones y Consultoría Marsella limitada 60%; Representado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez con CC 79.267.382	$ 27.747.200,00	02/10/2014	02/01/2015	02/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002113	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	CONSORCIO MARSELLA .NIT 900.726.766-4. Conformado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez 40%-Construcciones y Consultoría Marsella limitada 60%; Representado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez con CC 79.267.382	$ 36.078.320,00	30/09/2014	30/12/2014	30/12/2014	LIQUIDADO
4600002211	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO EN ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS, MUTATA Y URRAO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	ALFA Y OMEGA INGENIEROS SAS	$ 182.179.202,00	10/09/2014	10/01/2015	10/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002219	SUMINISTRO DE FILTROS POTABILIZADORES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	U.T IGG 2014 (IEANA GREEN GROUP SAS FUNDASET 35%	$ 397.072.640,00	01/10/2014	01/01/2015	01/01/2015	LIQUIDADO
4600002326	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA VEREDA SAN BASILIO MEDIO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE GUADALUPE	$ 250.000.000,00	24/09/2014	24/12/2014	24/12/2014	LIQUIDADO
4600002407	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE HISPANIA	$ 299.999.951,00	07/10/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002447	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	JORGE MARIO PATIÑO ZULUAGA CC. 98.593.444 OPCION INGENIERIA S.A,S NIT 900.372.514-4	$ 191.097.038,00	02/10/2014	17/11/2014	17/11/2014	LIQUIDADO
4600002449	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE SHOIBADO DE LA VEREDA SAN PEDRO MEDIO EN EL MUNCIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCTORA BETANCUR S.A.S NIT. 900.181.453-3 JAFET BETANCUR GIRON CC. 71.250.971	$ 248.805.618,00	02/10/2014	02/01/2015	02/01/2015	POR LIQUIDAR
4600002458	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO GJ INGENIERIA NIT 900.773.582-6 FERNANDO LEON GIRALDO JARAMILLO CC. 71.110.184	$ 281.390.148,00	30/09/2014	30/12/2014	30/12/2014	POR LIQUIDAR
4600002895	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO VIGÍA NIT 900.795.332-6	$ 10.992.899.738,00	11/12/2014	11/12/2015	11/07/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-AS-37-0124	CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO MEDIANTE EL CUAL EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL SE VINCULA AL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	$ 0,00	16/10/2014	31/12/2015	31/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0001	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDES – ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	UNION TEMPORAL RAMICON 2014 NIT 900707991-4 integrada por CONHYDRA S.A E.S.P 50%, RAMIREZ & CIA. S.A 50%, representada legalmente por AMED EUGENIO MONTOYA NARANJO, c.c. 70.553.760 DIRECCION Calle 32 F#63A-117 - Medellin	$ 2.049.739.699,00	12/05/2014	12/01/2015	12/03/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0002	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA - ETAPA I	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS S.A, NIT 800214137-1 representada legalmente por ALVARO JOBANNY GOMEZ JARAMILLO, con c.c. 8.349.200 - Calle 38 Sur #43A-24 Of.201 Envigado	$ 986.089.077,00	21/04/2014	21/10/2014	21/10/2014	LIQUIDADO
2014-OO-37-0003	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE MACEO. ETAPA II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 811011847-0 representada legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN, con c.c. 71.591.704	$ 1.222.077.978,00	13/05/2014	13/11/2014	13/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0004	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP – PDA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PAECIAS S.A.SNit 890.929.487-0, representante legal ANDRÉS FELIPE ESPINOSA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.792.037. Dirección: Carrera 25 No. 1 A Sur - 155 oficina 247 de la ciudad de Medellín, teléfono 604 140 72, Email: agpines@hotmail.com	$ 1.204.937.564,00	29/08/2014	28/02/2015	16/04/2015	LIQUIDADO
2014-OO-37-0009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PALACIOS ZAPATA 2014 (CARLOS MARIO PALACIO CHAMAT 75%-EDGAR ALONSO ZAPATA ARANGO 25%)	$ 3.492.740.818,00	12/11/2014	12/08/2015	12/08/2015	CONTRATO SUSPENDIDO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0010	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, TERCERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO I	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO CM ANTIOQUIA (CASCO S.A.S 75% - MIC3 S.A.S 25%) REPRESENTADO POR EL SEÑOR ANDRES FELIPE RESTREPO ANGEL CC. 8.025.797)	$ 1.860.197.321,00	09/12/2014	09/06/2015	09/09/2015	POR LIQUIDAR
2014-OO-37-0011	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PRIMERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSTUCCIONES Y TRACTORES S.A-CONYTRAC CON NIT 890.932.730-7 REPRESENTADO POR EL SEÑOR JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS CON CC. 70.556.498	$ 686.922.735,00	01/12/2014	01/04/2015	01/04/2015	LIQUIDADO
2014-OO-37-0012	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PRIMERA ETAPA - ANTIOQUIA. GRUPO III	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MM (CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ 50% - JOSE MARIO GIRALDO ENCISO 50%) REPRESNETADO LEGALMENTE POR CARLOS MARIO ZAPATA RAMIREZ COJ CC. 10.131.889	$ 1.850.049.464,00	10/11/2014	10/05/2015	10/05/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0014	GRUPO I: OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ETAPA 2	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	MECONSTRUEQUIPOS S.A. NIT 900.211.521-6	$ 643.504.482,00	15/01/2015	15/04/2015	30/05/2015	POR LIQUIDAR
2014-OO-37-0015	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS SEGUNDA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT NIT 15435479	$ 4.001.029.490,00	01/12/2014	01/08/2015	16/12/2015	POR LIQUIDAR
2014-OO-37-0016	GRUPO III: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL – ETAPA 1.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	INGEOMEGA S.A. NIT 800.027.813-0	$ 2.017.439.843,00	28/11/2014	28/03/2015	28/06/2015	POR LIQUIDAR
2014-OO-37-0017	GRUPO IV: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ETAPA 2.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	UNION TEMPORAL ESICON PDA 19 2014	$ 1.462.244.252,00	01/12/2014	01/04/2015	01/04/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2014-OO-37-0018	GRUPO V: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE URAMITA	LICITACIÓN PUBLICA	CONTRATACIÓN	CONSORCIO JG-VC	$ 1.645.546.928,00	12/12/2014	12/05/2015	12/07/2015	POR LIQUIDAR
2014-SS-37-0014	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CONSORCIO PLAN MAESTRO ITUANGO (INGENIERIA BASICA S.A.S. 50% - ECOVIAS S.A.S. 50%)	$ 288.102.240,00	10/11/2014	10/09/2015	10/09/2015	CONTRATO SUSPENDIDO
4600003953	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL MUNICIPIO DE EBEJICO, OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO REDES ANTIOQUIA IMC NIT 900.852.475-5	$ 1.250.115.584,00	26/06/2015	26/10/2015	26/11/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CARLOS (GRUPO I)								
4600003899	Grupo II: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ALFONSO LOPEZ EN CIUDAD BOLIVAR (GRUPO II)	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	AGUIDEL SAS NIT 811.001.387-1	$ 1.703.126.049,00	15/07/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
4600003977	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL MUNICIPIO DE EBÉJICO, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, (GRUPO I), CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CONSORCIO ANTIOQUIA 2015NIT 900.853.083-6	$ 260.387.520,00	23/06/2015	23/12/2015	23/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CORREGIMIENTO DE ALFONSO LÓPEZ EN CIUDAD BOLÍVAR. (GRUPO II)								
4600004502	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO CASTRILLON ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS NIT 900.868.642-9 REP LEGAL MANUEL CAMILO SOTO CC 1130617753	$ 1.920.467.006,00	24/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600004497	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CONSORCIO ANTIOQUIA 2015 (Ruth Helena Tabares Zuleta 50% - Siga Ingeniería S.A.S 50%) representado por la Señora RUTH ELENA TABARES ZULETA mayor de edad, identificada con la Cedula de Ciudadanía N° 30.303.454 de Manizales.	$ 192.702.100,00	24/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
4600004603	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELENCITO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	INSOAM E.U 900.255.039-6 REP. LEGAL JUAN FELIPE MORALES TABARES CC 71221197	$ 478.032.389,00	02/10/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-OO-37-0012	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	GRUCON SAS NIT 800203342-8	$ 245.108.320,00	21/07/2015	21/09/2015	21/09/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	RESOLUCION No. 201500280363								
2015-SS-37-0005	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRIA, ANDES, ANGOSTURA, ANZA, ARBOLETES, CARAMANTA Y TAMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CONSORCIO INTER ACUEDUCTO ANTIOQUIA (INGENIERIA BASICA S.A.S. 50% - ECOVIAS S.A.S. 50%) REPRESENTANTE LEGAL : CRISTINA OLIVEROS ZAPATA CC. 43.830.686	$ 294.950.300,00	13/05/2015	14/09/2015	14/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-SS-37-0006	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	CONCURSO DE MÉRITOS	OBRA PÚBLICA	UNION TEMPORAL HC INGENIEROS ANTIOQUIA - HERNAN CUERVO	$ 391.764.909,00	25/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	POR LIQUIDAR
2015-SS-37-0008	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO S.A.S NIT 811.010.867-3	$ 85.761.120,00	25/11/2015	25/03/2016	25/03/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA								
	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO DE JARDÍN, MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	PENDIENTE	$ 256.000.000,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
2015-OO-37-0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ALEJANDRIA, ANDES, ANGOSTURA, ANZA, ARBOLETES, CARAMANTA Y TAMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	INGEOMEGA S.A NIT. 800.027.813-0	$ 2.737.224.136,00	19/05/2015	19/09/2015	09/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0002	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ- ETAPA II.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONOSRCIO SAN JUAN 2015 (CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT 50% - EDGAR ALONSO ZAPATA 25% - DISEÑO ABSOLUTO SA 25%	$ 8.947.077.750,00	08/07/2015	08/05/2016	08/05/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0003	GRUPO I CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ETAPA II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO C & A integrado por (ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P – A.A.S S.A E.S.P 50% - COLOMBIANA DE INGENIERÍA Y AGUAS S.A. CIAS S.A 50%)	$ 3.938.084.345,00	13/07/2015	13/04/2016	13/04/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0004	GRUPO II CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - SEGUNDA ETAPA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ CC. 16.746.985	$ 680.787.822,00	02/07/2015	02/10/2015	02/10/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0005	GRUPO II CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MARTINA PLAN MAESTRO SEGOVIA (GEDESA S.A 50% - ICG LTDA 50%) NIT 900.850.895-6	$ 2.558.302.113,00	22/07/2015	22/03/2016	22/03/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0006	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA – ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2015 integrado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT y CONSTRUCCIONES PALOR SAS	$ 1.191.007.029,00	19/08/2015	19/01/2016	19/01/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0007	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRALDO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	MAURO VELEZ GOMEZ CC. 71,338,676	$ 1.030.209.384,00	07/07/2015	07/11/2015	07/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-OO-37-0008	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA ETAPA 2.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PLAN MAESTRO 06 integrado por PROVIAS SAS y CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA	$ 3.325.571.810,00	13/07/2015	13/03/2016	13/03/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0009	EJECUCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ ZONA URBANA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PLAN MAESTRO 2015 integrado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT y CONSTRUCCIONES PALOR SAS	$ 1.811.331.772,00	08/07/2015	08/01/2016	08/01/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0017	GRUPO I: MUNICIPIO DE NECOCLÍ: OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ETAPA I	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S NIT. 811.046.667-2	$ 2.132.031.402,00	03/11/2015	03/05/2016	03/05/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0018	GRUPO II: MUNICIPIO DE PUERTO NARE: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	OSCAR ANDRES GOMEZ GALVIS CC 91.291.293	$ 1.547.731.509,00	05/11/2015	05/05/2016	05/05/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0013	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ETAPA I.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	AZ CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT No.811.011.847-0, representado legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía N° 71.591.704 de Medellín; GRUPO I	$ 1.599.112.067,00	13/10/2015	13/05/2016	13/05/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0014	Grupo II: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE COLECTORES Y REDES SECUNDARIAS DEL BARRIO SAN ANTONIO Y LOS ALMENDROS - ZONA URBANA MUNICIPIO DE DON MATIAS	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	AZ CONSTRUCCIONES SAS. identificado con NIT No.811.011.847-0, representado legalmente por ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía N° 71.591.704 de Medellín	$ 1.891.085.679,00	19/10/2015	19/05/2016	19/05/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0015	Grupo III: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA I.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO DISEÑO PALOR integrado por CONSTRUCCIONES PALOR SAS 50% y DISEÑO ABSOLUTO SA 50%, representado por JUVENAL ALEXANDER PALACIOS CHAMAT identificado con cedula de ciudadanía 71.774.893 de Medellín al GRUPO III	$ 3.229.374.615,00	01/10/2015	01/06/2016	01/06/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0016	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO MURILLO ARANA (ANDRES RICARDO MURILLO 50% - BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA 50%)	$ 851.215.154,00	25/11/2015	25/03/2016	25/03/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-OO-37-0019	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AMALFI – ETAPA II	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO PD PLAN MAESTRO AMALFI (CONSTRUCCIONES PALOR S.A.S 50% - DISEÑO ABSOLUTO S.A 50%)	$ 2.585.023.811,00	11/11/2015	11/07/2016	11/07/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0020	GRUPO II: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ETAPA 1	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	OMEGA INGENIERIA ASOSCIADOS S.A.S NIT 811.046.667-2	$ 586.698.642,00	11/11/2015	11/03/2016	11/03/2016	EN EJECUCIÓN
2015-OO-37-0021	GRUPO I CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CONSORCIO SAN FERNANDO REY (JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 75% - EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL COLOMBIA 25%)	$ 1.913.134.955,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	LEGALIZADO
2015-OO-37-0022	GRUPO II: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA ETAPA II.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	$ 3.124.539.674,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	LEGALIZADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN, MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 3.651.860.331,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
2015-SS-37-0010	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELENCITO, MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO BELENCITO (JUAN FELIPE DEL VALLE CANO - 50% FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S - 50%)	$ 59.362.000,00	02/10/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-AS-37-0098	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA TAFETANES - MUNICIPIO DE SAN JERONIMO – ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	REGIONAL DE OCCIDENTE S.A NIT 900130596-1	$ 1.162.111.893,00	11/06/2015	11/12/2015	11/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-AS-37-0005	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LA RED DE ADUCCIÓN EN EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL MANANTIALES EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS OSCAR ALBERTO DE JESUS PEREZ BETANCUR CC. 15.253.606	$ 203.000.000,00	25/03/2015	25/10/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-AS-37-0089	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO S.A E.S.P NIT. 811.043.219-2 REP. LEGAL DORA ELENA RAMIREZ FRANCO CC. 43796666	$ 853.230.824,00	29/04/2015	29/11/2015	29/11/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-AS-37-0095	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, SECTOR SUR DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - CORANTIOQUIA NIT 890.981.105-2 811.000.231-7	$ 1.323.794.908,00	15/05/2015	15/12/2015	15/12/2015	EN EJECUCIÓN
2015-AS-37-0007	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HISPANIA.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE HISPANIA EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P	$ 336.008.892,00	27/03/2015	27/10/2015	27/10/2015	POR LIQUIDAR
2015-AS-37-0090	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE FRAGUAS, MUNICIPIO DE SEGOVIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE SEGOVIA	$ 1.883.983.069,00	30/04/2015	30/11/2015	30/11/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-AS-37-0102	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL SECTOR COLEGIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLI	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE CARACOLI	$ 196.742.753,00	03/07/2015	03/12/2015	03/12/2015	POR LIQUIDAR
2015-AS-37-0108	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO DE JARDÍN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTRO DE VIVIENDA Y MUNICIPIO DE CACERES	$ 3.907.951.983,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN
2015-AS-37-0002	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL TRATAMIENTO EN SITIO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS RURALES EN EL	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVANIT 811.032.187-8	$ 1.252.800.000,00	20/02/2015	19/10/2015	19/10/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
2015-AS-37-0001	CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO MEDIANTE EL CUAL EL MUNICIPIO DE TOLEDO SE VINCULA AL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE TOLEDO	$ 0,00	16/01/2015	31/12/2015	31/12/2015	EN EJECUCIÓN
2015-AS-37-0008	CONVENIO INTERADMIISTRATIVO DE ASOCIACION PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE NIT 800.013.060-0	$ 521.299.505,00	21/04/2015	21/11/2015	21/11/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-SS-37-0009	SUMINISTRO DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	IWANA GREEN GROUPS S.A.S NIT 900.298.022-6	$ 599.842.816,00	14/09/2015	14/12/2015	14/12/2015	LIQUIDADO
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COLECTOR Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS LAS DELICIAS, LAS MARÍAS Y VILLA LUZ, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 4.486.551.203,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - SEGUNDA ETAPA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 1.407.669.051,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA – ETAPA 2 E IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 5.782.642.263,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.								
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 2.517.514.855,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 2.933.343.900,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ZONA URBANA MUNICIPIO DE TITIRIBI-ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 8.669.144.937,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 2.220.900.093,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 733.476.429,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CORREGIMIENTO MANGLAR DEL MUNICIPIO DE GIRALDO								
	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES PARA EL SECTOR DE CALLE VIEJA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 480.617.131,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y REDES DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 1.883.771.810,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL TOCAIMA, EL CARBON, LA PAVA Y PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 2.407.087.804,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA ETAPA 1	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 3.361.249.603,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 991.287.092,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS EL DEPARTAMENTO, LA PLANTA Y MONACO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ – ANTIOQUIA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	$ 4.671.405.643,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2012-CF-37-0139	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, QUE GARANTICE LA EFICIENCIA, EFICACIA, COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	$ 280.000.000,00	11/12/2012	10/05/2013	10/10/2013	LIQUIDADO
2012-CF-37-0141	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDAS NO. 1 Y 2 PARA LA AMPLIACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE BETULIA	$ 331.535.616,00	10/12/2012	09/09/2013	09/02/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DEL RELLENO SANITARIO LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA.								
4600000407	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA EL APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DE CHIGORODO E.S.P	$ 306.000.000,00	30/08/2013	13/12/2013	30/01/2014	LIQUIDADO
4600000514	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION PARA EL APOYO FINANCIERO Y TECNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS	$ 280.000.000,00	30/08/2013	13/12/2013	13/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600000938	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR BALANCE Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA EN EJECUCIÓN DE LOS PGIRS EN EL MEDIANO PLAZO COMO UNA ESTRATEGIA ORIENTADORA DEL SEGUIMIENTO Y LA ACTUALIZACION, LAS ACCIONES PARA LA OPTIMIZACION DE LOS RELLENOS SANITARIOS Y LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA JURISDICCION DE CORANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	CORANTIOQUIA	$ 525.872.064,00	18/11/2013	18/09/2014	05/12/2014	POR LIQUIDAR
4600001107	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE URRAO	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	UNIÓN TEMPORAL RESIDUOS URRAO (CORPORACION HORIZONTE AZUL 50% - ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S.S.A. E.S.P. 50%)	$ 270.891.913,00	26/11/2013	24/01/2014	18/06/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001150	CONVENIO INTERADMINSITRATIVO PARA EL APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	$ 325.970.000,00	08/11/2013	12/12/2013	13/12/2013	LIQUIDADO
4600001560	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (RELLENO SANITARIO) EN EL MUNICIPIO DE PEQUE-ANTIOQUIA	CONCURSO DE MÉRITOS	CONTRATACIÓN	CORPORACION HORIZONTE AZULNIT:811.033.451-2, Representada Legalmente por el señor JOSE HARVY RESTREPO JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.745.607. Calle 41#77-06 - Medellin	$ 198.986.400,00	07/07/2014	07/10/2014	07/10/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001762	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	$ 272.786.667,00	20/08/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO
4600001763	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE JERICO	$ 307.911.333,00	21/08/2014	21/01/2015	21/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001764	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE FREDONIA	$ 296.893.887,00	25/08/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO
4600002076	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MURINDÓ E.S.P. NIT 811.034.077-5 Representante legal Alexander Maquilon Palacio con CC 70.410.664	$ 118.313.388,00	10/09/2014	10/02/2015	10/02/2015	POR LIQUIDAR
4600002115	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE LA PINTADA	$ 249.388.000,00	24/09/2014	24/01/2015	24/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	MUNICIPIO DE LA PINTADA								
4600002121	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION S.A. NIT 811.014.879-1 Representada por Carmen Judith Valencia Moreno con cc 43.472.416	$ 316.099.869,00	09/09/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO
4600002215	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO MANUAL - MECÁNICO "LAS AMÉRICAS" MUNICIPIO DE YONDÓ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO ESP	$ 550.000.000,00	30/09/2014	30/12/2014	30/12/2014	LIQUIDADO
4600002233	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELMIRA EMPUBEL E.S.P	$ 486.413.177,00	22/09/2014	06/01/2015	06/01/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DE BELMIRA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
4600002484	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P NIT. 811.014.470-1 GERMAN DARIO VELEZ OCAMPO CC. 15.438.937	$ 259.933.150,00	30/10/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO
4600003070	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR, MUNICIPIO DE LA PINTADA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE LA PINTADA	$ 330.000.000,00	02/03/2015	25/06/2015	25/06/2015	LIQUIDADO
4600003423	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (RELLENO	CONCURSO DE MÉRITOS	OBRA PÚBLICA	CORPORACION HORIZONTE AZUL NIT 811.033.451-2	$ 300.362.406,00	08/04/2015	08/07/2015	08/07/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	SANITARIO) EN LOS MUNICIPIOS DE COCORNA Y DON MATIAS - ANTIOQUIA								
4600003163	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR. MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA OCCIDENTE LIMPIO S.A E.S.P NIT 900.057.276-6	$ 408.000.000,00	02/03/2015	02/07/2015	02/07/2015	LIQUIDADO
4600003424	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EPM NIT 890,904,996-1	$ 270.000.000,00	22/04/2015	22/08/2015	22/08/2015	LIQUIDADO
4600004359	MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA CC 12130133	$ 905.899.480,00	31/07/2015	30/11/2015	30/11/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE ABANDONO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA								
4600003934	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO MANUAL - MECÁNICO EN EL MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEQUE EDWIN JAIR USUGA ORTIZ CC. 1.035.580.851	$ 847.995.814,00	04/06/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
4600003537	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR-MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE NIT 890.984.068-1REP. LEGAL JUAN JOSE VASQUEZ CARDENASCC. 70125748	$ 150.000.000,00	16/04/2015	16/10/2015	16/10/2015	POR LIQUIDAR
4600003858	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P NIT 900.150.932-7	$ 308.551.151,00	19/06/2015	19/10/2015	19/10/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR, MUNICIPIO DE SANTA VEGACHÍ								
4600003851	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DE VEHICULO COMPACTADOR, MUNICIPIO DE SAN LUIS	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P NIT 900.515.140-9	$ 255.000.000,00	10/06/2015	10/10/2015	10/10/2015	LIQUIDADO
4600003911	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAMESIS E.S.P. S.A.S PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS Y AL TERRENO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMESIS.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TAMESIS E.S.P. S.A.S NIT. 900.378.953-1	$ 51.416.592,00	18/06/2015	18/09/2015	18/09/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600004092	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE JERICO	$ 281.361.732,00	08/07/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
4600004310	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE MURINDO	$ 101.807.846,00	24/06/2015	16/12/2015	16/12/2015	POR LIQUIDAR
4600004652	SUMINISTRO DE VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS - ANDAR S.A 890.913.902-6	$ 203.575.360,00	26/10/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600004657	SUMINISTRO DE VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ECOEQUIPOS S.A.S 900.369.869-2	$ 290.402.890,00	26/10/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
2012-CF-37-0143	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE EXPANSIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “GAS SIN FRONTERAS” EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 11.237.896.000,00	14/12/2012	14/10/2013	14/10/2013	LIQUIDADO
4600000391	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL-INSTALACIONES	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 2.395.856.255,00	20/09/2013	31/12/2013	31/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	DOMICILIARIAS DE ENERGÍA – EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ANTIOQUIA ILUMINADA” EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
4600000508	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA GAS SIN FRONTERAS	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 3.992.636.077,00	20/09/2013	15/12/2013	30/09/2014	LIQUIDADO
4600000842	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS SOLARES EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	TRONEX S.A.	$ 40.368.000,00	17/10/2013	17/12/2013	17/12/2013	LIQUIDADO
4600000932	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	$ 216.000.000,00	15/11/2013	31/12/2013	30/06/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001429	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA PARA LAS ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ABCONTROL INGENIERIA S.A.S CON NIT. 830.108.265-1 REPRESENTADO LEGALMENTE POR HARVEY RIAÑO CASTELLANOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 79.047.099 EXPEDIDA EN BOGOTA	$ 203.812.624,00	14/05/2014	14/08/2014	14/08/2014	LIQUIDADO
4600001778	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTIOQUIA ILUMINADA" PARA LA COFINANCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EPM	$ 2.866.602.887,00	27/08/2014	27/12/2014	27/12/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001899	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "GAS SIN FRONTERAS""	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EPM	$ 9.482.888.800,00	29/08/2014	29/12/2014	29/12/2014	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600001944	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROCENTRAL, VEREDA CONCHA ABAJO, MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	OBRA PÚBLICA	CONHIME S.A.S. Nit: 811.027.144-1, Representado Legalmente por el señor RAÚL ARIAS GALLEGO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.130.854- Dirección: calle 54 No. 56 - 15 de la ciudad de Medellín, teléfono 293 20 19 - 321 830 79 30, Email: conhimeltda@yahoo.es - jesus.meza@conhime.com.	$ 246.457.105,00	28/08/2014	28/11/2014	28/11/2014	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002062	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROCENTRAL, VEREDA CONCHA ABAJO, MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	CONSORCIO MARSELLA .NIT 900.726.766-4. Conformado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez 40%-Construcciones y Consultoría Marsella limitada 60%; Representado por Juan Carlos Sanabria Rodriguez con CC 79.267.382	$ 26.083.180,00	28/08/2014	13/12/2014	13/12/2014	LIQUIDADO
4600002184	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EPM	$ 858.284.257,00	10/09/2014	26/12/2014	26/12/2014	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600002200	APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIAR EL COSTO DE LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS PARA LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	ALCANOS DE COLOMBIA S.A	$ 317.375.000,00	15/09/2014	15/12/2014	15/12/2014	LIQUIDADO
4600002657	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA EL AUMENTO DE LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	APROTEC S.A.S NIT 900.409.806-1	$ 249.317.402,00	04/11/2014	12/12/2014	12/12/2014	LIQUIDADO
4600003109	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIAR EL COSTO DE LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS PARA LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP NIT 891.101.577-4	$ 600.000.000,00	19/03/2015	19/10/2015	19/10/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CARMEN DE VIBORAL Y PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA								
4600003283	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE GAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "GAS SIN FRONTERAS""	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EPM NIT 890.904.996-1	$ 4.586.033.400,00	08/05/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
4600003541	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ANTIOQUIA ILUMINADA" PARA LA COFINANCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT. 890.904.996-1 REP LEGAL: JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO CC. 70566038	$ 1.300.000.000,00	27/06/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600003912	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN ZONAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT 890.904.996-1	$ 1.143.229.767,00	18/06/2015	14/12/2015	14/12/2015	POR LIQUIDAR
4600004134	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. PARA EL AUMENTO EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P NIT 890.904.996-1	$ 2.335.139.825,00	24/06/2015	06/12/2015	06/12/2015	POR LIQUIDAR
2012-SS-37-033	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S	$ 15.000.000,00	01/06/2012	22/12/2012	22/12/2012	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DURANTE EL AÑO 2012.								
2013-SS-37-0008	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DURANTE EL AÑO 2013.	MÍNIMA CUANTÍA	CONTRATACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA	$ 42.760.570,00	20/02/2013	31/12/2013	31/12/2013	LIQUIDADO
2014-SS-37-0001	ADQUISICION DE TIQUETES AÉREOS PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ESCOBAR OSPINA S.A.S. (VIAJES CALITOUR) NIT 860.450.022-2	$ 60.000.000,00	08/05/2014	31/12/2014	28/02/2015	LIQUIDADO
4600003388	ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	ESCOBAR OSPINA S.A.S (VIAJES CALITOUR) NIT 860.450.022-2 REP. LEGAL: LIGIA ESCOBAR OSPINA CC. 31.288.583	$ 50.000.000,00	24/03/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
4600003405	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATACIÓN	EMPRESTUR S.A NIT. 811030670-5	$ 100.000.000,00	07/04/2015	15/12/2015	15/12/2015	POR LIQUIDAR
2012-CF-37-0011	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TURBO. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO N°15 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TURBO.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 1.464.100.000,00	15/08/2012	31/12/2012	31/12/2013	LIQUIDADO
2012-CF-37-0122	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	AGUAS DE URABA S.A E.S.P	$ 1.996.176.524,00	28/12/2012	28/02/2013	31/12/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TURBO								
2012-CF-37-0140	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, PARA APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO AL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, QUE GARANTICE LA EFICIENCIA, EFICACIA, COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	$ 303.000.000,00	11/12/2012	10/05/2013	10/05/2013	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0328	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y AGUAS DE URABA S.A. E.S.P. PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR EL BOHÍO ETAPA II, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ” EN EL MARCO DEL ACUERDO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO DEL ATRATO GRAN DARIÉN.	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 3.768.113.783,00	05/11/2013	31/12/2013	31/12/2014	EN EJECUCIÓN
2013-CF-37-0329	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y AGUAS DE URABA S.A. E.S.P. PARA COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 695.892.555,00	05/11/2013	31/12/2013	31/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	AL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTIN” EN EL MARCO DEL ACUERDO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO DEL ATRATO GRAN DARIÉN								
2013-CF-37-0331	GESTIONAR POR PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRAR EL CONTRATO PARA LA EN EJECUCIÓN DEL PDA ETAPA 2 DEFINIDO EN LA “LÍNEA DE SERVICIOS PÚBLICOS” PARA EL MUNICIPIO DE ITUANGO CONCERTADA EN EL “PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL”, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	$ 0,00	03/01/2014	27/04/2015	03/12/2015	POR LIQUIDAR

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	HIDROELÉCTRICO ITUANGO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EPM								
2013-CF-37-0332	CONVENIO MARCO DE VINCULACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN Y EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO Y DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE HARÁ EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN DE CORPOURABÁ.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	CORPURABA	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0333	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES AL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA PAP-PDA. (INTERVIENEN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS).	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE DONMATÍAS	$ 0,00	02/08/2013	31/12/2015	31/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0334	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO PARA LA VINCULACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES AL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA PAP-PDA. (INTERVIENEN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA).	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA	$ 0,00	02/08/2013	31/12/2015	31/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0336	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA “ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LOS CUALES LA NACIÓN FINANCIARÁ PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES PARA EL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2732/ -OC- CO.”	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	07/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0338	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA PARA "ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSITA, EL PALOMAR Y PUERTO COLOMBIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0339	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE PARA “ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS EL PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0340	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ PARA “ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, MULATOS Y LAS CHANGAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0341	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CÁCERES PARA "ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES MANIZALES Y PIAMONTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES"	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0342	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CÁCERES PARA “ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EXTENSIÓN DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CORREGIMIENTO JARDÍN, MUNICIPIO DE CÁCERES”	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-CF-37-0343	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE TURBO PARA “ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EN EJECUCIÓN DE: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES NUEVA GRANADA, SAN JOSÉ MULATO Y PUEBLO BELLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TURBO	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	$ 0,00	08/11/2013	31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDADO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2013-OO-37-0030	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LOS SECTORES INDEPENDIENTES LA ARBOLEDA, HOSPITAL Y MATADERO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	CHAMAT INGENIEROS LTDA	$ 635.989.813,00	07/01/2014	07/05/2014	07/05/2014	LIQUIDADO
2014-AS-37-0139	GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRAR LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS NECESARIAS DEFINIDAS EN EL PDA PARA EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN SU ETAPA 2 DEL PDA CORRESPONDIENTE A OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	EPM NIT 890.904.996-1	$ 0,00	27/02/2015	15/12/2015	15/05/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	SUS RESPECTIVAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE HACEN PARTE DE LA “LÍNEA DE SERVICIOS PÚBLICOS” CONCERTADA EN EL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.								
2014-AS-37-0150	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA MANTEQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CELEBRADO ENTRE ACUANTIOQUIA E.P.S. Y ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLE S.A. E.S.P.,	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A - A.A.S S.A E.S.P	$ 0,00	29/10/1997	31/12/2015	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	POSTERIORMENTE CEDIDO POR ACUANTIOQUIA AL MUNICIPIO DE ARMENIA MANTEQUILLA-ANTIOQUIA, SUBROGADO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR DISPOSICIÓN DECRETO 1484 DE 2014								
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN SUS COMPONENTES SOCIALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS, AMBIENTALES E INSTITUCIONALES, EN LAS LOCALIDADES PIAMONTE Y MANIZALES DEL MUNICIPIO DE CACERES, SANTA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	PENDIENTE	$ 1.039.686.285,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	ROSITA, EL PALOMAR Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA Y VEREDAS PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS DEL MUNICIPIO DEL BAGRE								
2015-AS-37-0104	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MANIZALES Y PIAMONTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 442.609.363,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-AS-37-0105	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSITA, EL PALOMAR Y PUERTO COLOMBIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 268.349.378,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN
2015-AS-37-0106	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS EL PERICO, CAÑO CLARO Y LAS DANTAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTRO DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE BAGRE	$ 449.331.153,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
2015-AS-37-0107	AUNAR ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, MULATOS Y LAS CHANGAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MINISTERIO DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 849.430.812,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN
2015-AS-37-0109	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS - FIP Y EL DEPARTAMENTO DE	RÉGIMEN ESPECIAL	OBRA PÚBLICA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDE DE INVERSION PARA LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 7.154.754.666,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	ANTIOQUIA – GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS.								
2015-AS-37-0119	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO CUTURÚ, MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA”, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA HACER EFECTIVO EL APOYO FINANCIERO DE LA NACIÓN AL MUNICIPIO DE	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	MUNICIPIO DE CAUCASIA	$ 9.191.050.079,00	24/06/2015	31/12/2016	31/12/2016	EN EJECUCIÓN

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.								
	FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN SUS COMPONENTES SOCIALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS, ECONÓMICOS, AMBIENTALES E INSTITUCIONALES, EN LAS LOCALIDADES PUEBLO NUEVO, MULATOS Y LAS CHANGAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ.	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN	PENDIENTE	$ 761.138.720,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO I: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO II: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO III: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE ANZA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO IV: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO V: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
	GRUPO VI: CONTRATO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. (Numeral 6.1). O DE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (numeral 6.2) EN EL MUNICIPIO DE MURINDO.	LICITACIÓN PUBLICA	OBRA PÚBLICA	PENDIENTE	El contratista, operador especializado que resulte seleccionado para cada uno de los grupos estimados, como parte del proceso de agotamiento del numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 o las empresas de servicios públicos constituidas en cada uno de los municipios referidos, como parte del numeral 6.2, dentro del proceso de licitación pública recibirán como única remuneración por la ejecución del contrato de operación, administración, y mantenimiento las sumas provenientes de la aplicación y cobro de las tarifas por la	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	EN PROCESO

NUMERO DE	OBJETO DEL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR FINAL DEL CONTRATO	FE	FE	FE	ESTADO CONTRATO
					prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además, de los subsidios otorgados por el municipio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.				

10. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

INFORME DEL SUI

Al día de hoy la información correspondiente a Gobernación se encuentra certificada en un 100%.

COMPARATIVO DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN AL SUI								
		CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2014				CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2015		
Periodicidad	Año	Certificado	Porcentaje	Pendiente	Porcentaje	Certificado	Porcentaje	Pendiente
INFORMACIÓN ANUAL	2007	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	2008	0	0.00	13	11.71	13	11.71	0
	2009	12	10.81	0	0.00	12	10.81	0
	2010	4	3.60	13	11.71	17	15.32	0
	2011	0	0.00	10	9.01	10	9.01	0
	2012	0	0.00	4	3.60	4	3.60	0
	2013	0	0.00	4	3.60	4	3.60	0
	2014	0	0.00	4	3.60	4	3.60	0
TOTAL INFORMACIÓN CON VENCIMIENTO ANUAL		16	14.41	48	43.24	64	57.66	0
INFORMACIÓN MENSUAL	2007	1	0.90	1	0.90	2	1.80	0
	2008	0	0.00	12	10.81	12	10.81	0
	2009	8	7.21	5	4.50	13	11.71	0
	2010	0	0.00	8	7.21	8	7.21	0
	2011	0	0.00	12	10.81	12	10.81	0
TOTAL INFORMACIÓN CON VENCIMIENTO MENSUAL		9	8.11	38	34.23	47	42.34	0
TOTAL GENERAL		**25**	**22.52**	**86**	**77.48**	**111**	**100.00**	**0**

Con corte al 15 de Diciembre de 2015, el usuario Gestor de la Gobernación de Antioquia presenta un total de 82 formularios y formatos SUI habilitados, de los cuales 65 se encuentran certificados y 17 se encuentran pendientes de reportar. Con la información pendiente se presentaron problemas con la plataforma del SUI y fueron reportadas a la mesa de ayuda a través de llamadas telefónicas, por la opción de mesa de ayuda de la página y se han enviado coreos electrónicos tal como se puede evidenciar en los anexos; estos formatos son:

Año	Formato	Observación
2009 al 2014	02. Gestor PDA (Planes Departamentales de Agua) - Información por Municipio	Información recibida, PENDIENTE de reporte debido a que la plataforma se cae. Es en Línea.
2009, 2011 al 2014	03. Gestor PDA (Planes Departamentales de Agua) - Información por Municipio - Metas	El Formulario Gestor PDA(Planes Departamentales de Agua) - Información por Municipio es Pre requisito para poder certificar este formulario.

Año	Formato	Observación
2009 al 2014	05. Información de Recursos Comprometidos al PDA por Municipio	Mesa de ayuda 302944 del 12-02-2015, por Problemas en la plataforma del SUI.

A continuación se hace un cuadro comparativo del estado de la información en el 2014 cuando se comenzó con la asesoría y como se encuentra en este momento.

COMPARATIVO DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN AL SUI GESTOR					
		CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2014		CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2015	
Periodicidad	Año	Certificado	Pendiente	Certificado	Pendiente con Mesa de Ayuda
	2009	0	4	1	3
	2010	0	5	3	2
	2011	0	5	2	3
	2012	0	5	2	3
	2013	0	5	2	3
	2014	0	5	2	3
TOTAL INFORMACIÓN CON VENCIMIENTO ANUAL		**0**	**29**	**12**	**17**
	2009	12	0	12	0
	2010	5	7	12	0
	2011	0	12	12	0
	2012	0	12	12	0
	2013	0	5	5	0
TOTAL INFORMACIÓN CON VENCIMIENTO MENSUAL		**17**	**36**	**53**	**0**
TOTAL GENERAL		**17**	**65**	**65**	**17**

11. CONCEPTO GENERAL:

La labor como Gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia durante estos tres años, 10 meses y 14 días como parte de la política de Antioquia la más educada permitió llegar a todos los municipios del departamento con proyectos y programas encaminados a transformar la vida de las personas, de cada uno de los Antioqueños y Antioqueñas que habitan este territorio tan variable. Nuestros logros han sido:

Antioquia Potable

Acueducto y alcantarillado - Soluciones alternativas - Fortalecimiento empresarial

- **1'014.000 personas** de **111 municipios** de Antioquia transformaron su vida con agua potable y saneamiento básico (Se incluyen los 64 municipios del PDA - PAP).
- **Por primera vez** en las zonas urbanas de **5 municipios**: **San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte, Argelia, Cisneros y Murindó**, se lleva agua potable para mejorar la vida de 23.600 personas.
- **35.600 personas de 86 veredas** en 44 municipios de Antioquia consumen por primera vez agua potable. Salud y calidad de vida para más habitantes de este territorio.
- **72.000 personas** dejaron de contaminar quebradas, ríos y suelos con la adecuada recolección de sus aguas residuales.
- **55.122 estudiantes de 436 escuelas rurales**, en 114 municipios, consumen agua apta para el consumo humano en sus centros educativos.

Plan Departamental de Agua

- En Antioquia, **pasamos de 0 a 64** municipios con proyectos de servicios públicos domiciliarios a través del Programa Agua para la Prosperidad-Plan Departamental de Agua.
- Antioquia ocupa **el primer lugar** en ejecución del Plan Departamental de Agua. Construimos obras de infraestructura en **58 municipios.**
- Las **150 empresas** prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, recibieron asesoría para mejorar su gestión técnica, operativa, administrativa y financiera.
- **1.253 personas vinculadas a empresas operadoras de servicios públicos en 104 municipios** se capacitaron para mejorar la calidad del servicio que prestan a sus comunidades.

Antioquia con energía

Electrificación rural - Gas natural - Soluciones alternativas

- **430.000 personas** de zonas rurales de 116 municipios de Antioquia cuentan por primera vez con **energía eléctrica** para iluminar sus noches.
- Más economía para **920.000 personas** de 90 municipios y 18 corregimientos que se conectan al servicio de **gas natural,** una fuente de energía limpia.
- **La energía llegó a 15 comunidades indígenas lejanas** del Bajo Cauca y Urabá. **2.019 personas** pueden conservar sus alimentos, estudiar y reunirse en las noches, gracias al uso de paneles solares.

- **7.200 personas** mejoran su calidad de vida con la instalación de **sistemas alternativos de energía**, amigables con el medio ambiente.

Antioquia Limpia

Recolección - Transporte - Disposición de residuos sólidos - Capacitación

- **211.200 personas** de 18 municipios disfrutan de un ambiente más limpio con el transporte oportuno y adecuado de residuos sólidos en los 18 nuevos vehículos.

- **77.700 personas** de 13 municipios se benefician con nueva infraestructura para la adecuada disposición de los residuos sólidos.

- **Se fortalecieron 70 empresas** prestadoras del servicio de aseo en el cumplimiento de la normatividad ambiental y la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.

- **300 personas** se capacitaron para prestar un mejor servicio de aseo en sus municipios.

Con relación al Plan de Desarrollo de Antioquia la más educada el cumplimiento de los indicadores de producto, de resultado denotan un trabajo planeado y ejecutado dentro de las políticas de transparencia y eficiencia establecidas como política principal de legalidad de nuestro trabajo.

Solo resta agradecer y resaltar el trabajo conjunto con instituciones y personas que permitieron alcanzar las metas trazadas.

Cordialmente;

ASTRID HELENA BARRERA ROLDÁN
Gerente de Servicios Públicos
